

OFICIO Nº 341/2026 – GAB. SINURB

Chapadina MA, 30 de julho de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição do 1º termo aditivo dos serviços de reforma e substituição do telhado de fibrocimento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Social e Trânsito do município de Chapadina, executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **3ª medição do 1º termo aditivo** dos serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob nº CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de reforma e substituição do telhado de fibrocimento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Social e Trânsito do município de Chapadina**, Conforme:

Contrato nº 097/2026,
Processo Adm. nº 6229/2025,
Concorrência nº 040/2025,
NF nº 091,
Valor R\$ 121.457,04

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG. 4323-0
C/C. 50835-7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
DATA RECEBIMENTO 31/07/26
ÀS: 10:27h
ASSINATURA Deusilene Pontes

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

OFICIO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através do seu sócio proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **825.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar a 3 medição do contrato para execução dos serviços de reforma e substituição do telhado de fibrocimento da secretaria municipal de segurança publica, defesa social e transito do municipio de chapadinha - MA.

São Luís, MA – 24 de JULHO de 2026

THOMPSON
BEZERRA
CARNEIRO
SOBRINHO:845214
65315

Assinado de forma
digital por THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.07.29
13:35:49 -03'00'

IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO ADMINISTRADOR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UND	QNT	PÇ UNITARIO	PÇ TOTAL	AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	VALORES	AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	SALDO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 750,00								
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	unid.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00				R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ - 0,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 10.188,00								
2.1	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 28,30	R\$ 10.188,00	360,00				R\$ 10.188,00	R\$ -	R\$ 10.188,00	R\$ - 0,00
3			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS				R\$ 3.483,35								
3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M²	444,36	R\$ 1,84	R\$ 817,62	444,36				R\$ 817,62	R\$ -	R\$ 817,62	R\$ - 0,00
3.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M²	575,86	R\$ 4,30	R\$ 2.476,20	575,86				R\$ 2.476,20	R\$ -	R\$ 2.476,20	R\$ - 0,00
3.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M²	19,32	R\$ 9,81	R\$ 189,53	19,32				R\$ 189,53	R\$ -	R\$ 189,53	R\$ - 0,00
4			ALVENARIA E VEDAÇÕES				R\$ 10.604,70								
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M²	90,00	R\$ 117,83	R\$ 10.604,70	15,75	74,25	90,00		R\$ 1.855,82	R\$ 8.748,88	R\$ 10.604,70	R\$ - 0,00
5			REVESTIMENTO EXTERNO				R\$ 7.971,02								
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M²	186,50	R\$ 4,65	R\$ 867,23	31,50	155,00	186,50		R\$ 146,48	R\$ 720,75	R\$ 867,23	R\$ - 0,00
5.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M²	186,50	R\$ 38,09	R\$ 7.103,79	31,50	155,00	186,50		R\$ 1.199,84	R\$ 5.903,95	R\$ 7.103,79	R\$ - 0,00
6			COBERTURA				R\$ 109.241,88								
6.1	12718	ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02 - 10/2022	M²	627,28	R\$ 133,09	R\$ 83.484,70	627,28				R\$ 83.484,70	R\$ -	R\$ 83.484,70	R\$ - 0,00
6.2	C1353	SEINFRA	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUES	M²	71,36	R\$ 254,65	R\$ 18.171,82	71,36				R\$ 18.171,82	R\$ -	R\$ 18.171,82	R\$ - 0,00
6.3	12410	ORSE	Coluna metálica, em perfis UDC75x38x3,84, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos até 10,0m de vão, largura 0,50m, PDmax. 7,00, pintura01 demão de epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	M	17,40	R\$ 435,94	R\$ 7.585,36	17,40				R\$ 7.585,36	R\$ -	R\$ 7.585,36	R\$ - 0,00
7			FORRO				R\$ 35.349,48								

7.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	461,00	R\$ 76,68	R\$ 35.349,48	266,62	194,38	461,00	R\$ 20.444,42	R\$ 14.905,06	R\$ 35.349,48	R\$ -	0,0%
8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 2.418,30				R\$ 2.418,30	R\$ -	R\$ 2.418,30	R\$ -	0,0%
8.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	unid.	15,00	R\$ 161,22	R\$ 2.418,30	15,00		15,00	R\$ 2.418,30	R\$ -	R\$ 2.418,30	R\$ -	0,0%
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 3.479,59								
9.1			ÁGUA FRIA				R\$ 2.418,30								
9.1.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	unid.	15,00	R\$ 161,22	R\$ 2.418,30	15,00		15,00	R\$ 2.418,30	R\$ -	R\$ 2.418,30	R\$ -	0,0%
9.2			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 218,89								
9.2.1	36796	SINAPI	LOUSEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	unid.	1,00	R\$ 218,89	R\$ 218,89	1,00		1,00	R\$ 218,89	R\$ -	R\$ 218,89	R\$ -	0,0%
9.3			DRENAGEM DE AR CONDICIONADO				R\$ 842,40								
9.3.1	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	40,00	R\$ 21,06	R\$ 842,40	40,00		40,00	R\$ 842,40	R\$ -	R\$ 842,40	R\$ -	0,0%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGÍSTICAS				R\$ 19.489,73								
10.1			PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				R\$ 13.476,67								
10.1.1	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	28,00	R\$ 99,94	R\$ 2.798,32	28,00		28,00	R\$ 2.798,32	R\$ -	R\$ 2.798,32	R\$ -	0,0%
10.1.2	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	PT	60,00	R\$ 55,13	R\$ 3.307,80	60,00		60,00	R\$ 3.307,80	R\$ -	R\$ 3.307,80	R\$ -	0,0%
10.1.3	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	unid.	5,00	R\$ 47,11	R\$ 235,55	5,00		5,00	R\$ 235,55	R\$ -	R\$ 235,55	R\$ -	0,0%
10.1.4	12971	ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_ 11/2021	unid.	60,00	R\$ 76,13	R\$ 4.567,80	60,00		60,00	R\$ 4.567,80	R\$ -	R\$ 4.567,80	R\$ -	0,0%
10.1.5	3396	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	PT	10,00	R\$ 256,72	R\$ 2.567,20	10,00		10,00	R\$ 2.567,20	R\$ -	R\$ 2.567,20	R\$ -	0,0%
10.2			CABOS E ELETRODUTOS				R\$ 6.013,06								
10.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.022,14	R\$ 3,30	R\$ 3.373,06	1022,14		1022,14	R\$ 3.373,06	R\$ -	R\$ 3.373,06	R\$ -	0,0%
10.2.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R\$ 4,40	R\$ 2.640,00	600,00		600,00	R\$ 2.640,00	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ -	0,0%
11			ESQUADRIAS				R\$ 27.790,98								
11.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ 24.395,45								
11.1.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almeiada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	unid.	9,00	R\$ 1.732,30	R\$ 15.590,70	1,00	8,00	9,00	R\$ 1.732,30	R\$ 13.858,40	R\$ 15.590,70	R\$ -	0,0%
11.1.2	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	unid.	1,00	R\$ 262,00	R\$ 262,00	1,00		1,00	R\$ 262,00	R\$ -	R\$ 262,00	R\$ -	0,0%
11.1.3	1783	ORSE	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/ macaneta, acabam. inox 304 (STAM linha residencial, ref:18011/19 ou similar) e dobradiças apo, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Lider ou similar)	CJ	25,00	R\$ 341,71	R\$ 8.542,75	11,00	14,00	25,00	R\$ 3.758,81	R\$ 4.783,94	R\$ 8.542,75	R\$ -	0,0%
11.2			ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ 3.395,53								
11.2.1	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	M²	3,80	R\$ 893,56	R\$ 3.395,53	3,80		3,80	R\$ 3.395,53	R\$ -	R\$ 3.395,53	R\$ 0,00	0,0%
12			PINTURA INTERNA				R\$ 42.866,26								
12.1			PINTURA INTERNA				R\$ 28.748,11								
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	793,27	R\$ 3,63	R\$ 2.879,57	793,27		793,27	R\$ 2.879,57	R\$ -	R\$ 2.879,57	R\$ -	0,0%
12.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	793,27	R\$ 17,29	R\$ 13.715,64	793,27		793,27	R\$ 13.715,64	R\$ -	R\$ 13.715,64	R\$ 0,00	0,0%

12.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	793,27	R\$	15,32	R\$	12.152,90	793,27		793,27	R\$	12.152,90	R\$	-	R\$	12.152,90	R\$	0,00	0,0%
12.2			PINTURA EXTERNA			R\$		R\$	11.046,73												
12.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	614,47	R\$	3,63	R\$	2.230,53	517,47	97,00	614,47	R\$	1.878,42	R\$	352,11	R\$	2.230,53	R\$	0,00	0,0%
12.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	575,47	R\$	15,32	R\$	8.816,20	517,47	58,00	575,47	R\$	7.927,64	R\$	888,56	R\$	8.816,20	-R\$	0,00	0,0%
12.3			ESQUADRIAS DE MADEIRA			R\$		R\$	1.171,56												
12.3.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	41,94	R\$	15,67	R\$	657,20	23,52	18,42	41,94	R\$	368,56	R\$	288,64	R\$	657,20	R\$	0,00	0,0%
12.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	22,53	R\$	22,83	R\$	514,36	4,11	18,42	22,53	R\$	93,83	R\$	420,53	R\$	514,36	R\$	0,00	0,0%
12.4			ESQUADRIAS METÁLICAS			R\$		R\$	1.899,86												
12.4.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	38,02	R\$	49,97	R\$	1.899,86	38,02		38,02	R\$	1.899,86	R\$	-	R\$	1.899,86	R\$	0,00	0,0%
13			SERVIÇOS FINAIS			R\$		R\$	1.456,54												
13.1.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M²	627,82	R\$	2,32	R\$	1.456,54	627,82		627,82	R\$	1.456,54	R\$	-	R\$	1.456,54	-R\$	0,00	0,0%
14			ITENS NOVOS			R\$		R\$	44.389,60												
21.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1,27	R\$	109,91	R\$	139,59		1,27	1,27	R\$	-	R\$	139,59	R\$	139,59	-R\$	0,00	0,0%
21.2	C3104	SEINFRA	REMOÇÃO DE CERCASREMOÇÃO DE CERCA CONCRETINA	M	24,20	R\$	0,45	R\$	10,99		24,20	24,20	R\$	-	R\$	10,99	R\$	10,99	-R\$	0,00	0,0%
21.3	S00017	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	18,00	R\$	9,13	R\$	164,38		18,00	18,00	R\$	-	R\$	164,38	R\$	164,38	-R\$	0,00	0,0%
21.4	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIMAXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	130,00	R\$	7,29	R\$	947,20		130,00	130,00	R\$	-	R\$	947,20	R\$	947,20	R\$	0,00	0,0%
21.5	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M³	72,00	R\$	31,76	R\$	2.286,78		72,00	72,00	R\$	-	R\$	2.286,78	R\$	2.286,78	R\$	0,00	0,0%
21.6	C3059	SEINFRA	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$	215,45	R\$	215,45		1,00	1,00	R\$	-	R\$	215,45	R\$	215,45	-R\$	0,00	0,0%
21.7	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	105,00	R\$	12,12	R\$	1.273,00		105,00	105,00	R\$	-	R\$	1.273,00	R\$	1.273,00	R\$	0,00	0,0%
21.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$	8,04	R\$	2.410,94		300,00	300,00	R\$	-	R\$	2.410,94	R\$	2.410,94	R\$	0,00	0,0%
21.9	S01756	ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	R\$	706,81	R\$	706,81		1,00	1,00	R\$	-	R\$	706,81	R\$	706,81	-R\$	0,00	0,0%
21.10	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ARDIM DE 3/4"	UN	3,00	R\$	33,34	R\$	100,02		3,00	3,00	R\$	-	R\$	100,02	R\$	100,02	-R\$	0,00	0,0%
21.11	S02022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	8,00	R\$	68,99	R\$	551,93		8,00	8,00	R\$	-	R\$	551,93	R\$	551,93	R\$	0,00	0,0%
21.12	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$	12,83	R\$	128,35		10,00	10,00	R\$	-	R\$	128,35	R\$	128,35	R\$	0,00	0,0%
21.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	R\$	20,21	R\$	121,26		6,00	6,00	R\$	-	R\$	121,26	R\$	121,26	R\$	0,00	0,0%
21.14	S01677	ORSE	TÉ 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM = 40MM	UN	1,00	R\$	12,16	R\$	12,16		1,00	1,00	R\$	-	R\$	12,16	R\$	12,16	-R\$	0,00	0,0%
21.15	1967	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	R\$	5,96	R\$	5,96		1,00	1,00	R\$	-	R\$	5,96	R\$	5,96	-R\$	0,00	-0,1%

21.16	S03298	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT. DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	13,00	R\$ 223,26	R\$ 2.902,43		13,00	R\$ -	R\$ 2.902,43	R\$ 2.902,43	R\$ 0,00	0,0%
21.17	S12223	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 362,15	R\$ 362,15		1,00	R\$ -	R\$ 362,15	R\$ 362,15	R\$ 0,00	0,0%
21.18	C1084	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 76,10	R\$ 304,40		4,00	R\$ -	R\$ 304,40	R\$ 304,40	R\$ 0,00	0,0%
21.19	C1081	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	R\$ 76,10	R\$ 228,30		3,00	R\$ -	R\$ 228,30	R\$ 228,30	R\$ 0,00	0,0%
21.20	S09041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 50KA - 275V	UN	4,00	R\$ 86,49	R\$ 345,94		4,00	R\$ -	R\$ 345,94	R\$ 345,94	R\$ 0,00	0,0%
21.21	S13682	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	5,00	R\$ 150,06	R\$ 750,28		5,00	R\$ -	R\$ 750,28	R\$ 750,28	R\$ 0,00	0,0%
21.22	C4560	SEINFRA	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM	M²	16,71	R\$ 274,29	R\$ 4.583,32		16,71	R\$ -	R\$ 4.583,32	R\$ 4.583,32	R\$ 0,00	0,0%
21.24	96131	SINAPI	PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	58,00	R\$ 26,19	R\$ 1.519,17		58,00	R\$ -	R\$ 1.519,17	R\$ 1.519,17	R\$ 0,00	0,0%
21.25	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	227,00	R\$ 16,53	R\$ 3.751,65		227,00	R\$ -	R\$ 3.751,65	R\$ 3.751,65	R\$ 0,00	0,0%
21.26	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	258,60	R\$ 23,67	R\$ 6.122,35		258,60	R\$ -	R\$ 6.122,35	R\$ 6.122,35	R\$ 0,00	0,0%
21.27	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	1,20	R\$ 718,17	R\$ 861,80		1,20	R\$ -	R\$ 861,80	R\$ 861,80	R\$ 0,00	0,0%
21.28	S02266	ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	1,68	R\$ 90,27	R\$ 151,65		1,68	R\$ -	R\$ 151,65	R\$ 151,65	R\$ 0,00	0,0%
21.29	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (VIGA BALDRAME E SUPERIOR)	KG	61,62	R\$ 15,91	R\$ 980,07		61,62	R\$ -	R\$ 980,07	R\$ 980,07	R\$ 0,00	0,0%
21.30	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (VIGA BALDRAME E SUPERIOR)	KG	25,87	R\$ 19,69	R\$ 509,29		25,87	R\$ -	R\$ 509,29	R\$ 509,29	R\$ 0,00	0,0%
21.31	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (VIGA BALDRAME E SUPERIOR)	M³	1,33	R\$ 545,60	R\$ 725,65		1,33	R\$ -	R\$ 725,65	R\$ 725,65	R\$ 0,00	0,0%
21.32	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	1,33	R\$ 297,35	R\$ 395,47		1,33	R\$ -	R\$ 395,47	R\$ 395,47	R\$ 0,00	0,0%
21.33	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	5,40	R\$ 43,96	R\$ 237,40		5,40	R\$ -	R\$ 237,40	R\$ 237,40	R\$ 0,00	0,0%
21.34	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,62	R\$ 10,97	R\$ 324,89		29,62	R\$ -	R\$ 324,89	R\$ 324,89	R\$ 0,00	0,0%
21.35	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,24	R\$ 13,96	R\$ 128,99		9,24	R\$ -	R\$ 128,99	R\$ 128,99	R\$ 0,00	0,0%
21.36	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,42	R\$ 545,60	R\$ 229,15		0,42	R\$ -	R\$ 229,15	R\$ 229,15	R\$ 0,00	0,0%

21.37	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M²	0,42	R\$ 297,35	R\$ 124,89		0,42	R\$ -	R\$ 124,89	R\$ 124,89	R\$ 0,00	0,0%
21.38	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	4,00	R\$ 79,13	R\$ 316,52		4,00	R\$ -	R\$ 316,52	R\$ 316,52	R\$ 0,00	0,0%
21.39	93187	SINAPI	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	2,60	R\$ 77,77	R\$ 202,20		2,60	R\$ -	R\$ 202,20	R\$ 202,20	R\$ 0,00	0,0%
21.40	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,85	R\$ 449,66	R\$ 382,21		0,85	R\$ -	R\$ 382,21	R\$ 382,21	R\$ 0,00	0,0%
21.41	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M²	19,00	R\$ 71,78	R\$ 1.363,73		19,00	R\$ -	R\$ 1.363,73	R\$ 1.363,73	R\$ 0,00	0,0%
21.42	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	15,00	R\$ 10,00	R\$ 150,02		15,00	R\$ -	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 0,00	0,0%
21.43	C4778	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDA E LIMPEZA	M	44,00	R\$ 63,80	R\$ 2.807,11		44,00	R\$ -	R\$ 2.807,11	R\$ 2.807,11	R\$ 0,00	0,0%
21.44	C4786	SEINFRA	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDA E LIMPEZA	M	11,00	R\$ 184,45	R\$ 2.028,99		11,00	R\$ -	R\$ 2.028,99	R\$ 2.028,99	R\$ 0,00	0,0%
21.45	S11412	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	136,00	R\$ 15,34	R\$ 2.086,56		136,00	R\$ -	R\$ 2.086,56	R\$ 2.086,56	R\$ 0,00	0,0%
21.46	S11506	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	M	20,00	R\$ 6,25	R\$ 124,99		20,00	R\$ -	R\$ 124,99	R\$ 124,99	R\$ 0,00	0,0%
21.47	S11508	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2"	M	33,00	R\$ 6,76	R\$ 223,17		33,00	R\$ -	R\$ 223,17	R\$ 223,17	R\$ 0,00	0,0%
21.48	I09635	ORSE	FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO 50MM X 30M	UN	6,00	R\$ 15,01	R\$ 90,04		6,00	R\$ -	R\$ 90,04	R\$ 90,04	R\$ 0,00	0,0%

VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 319.479,43	R\$ 224.218,99	R\$ 95.260,42	R\$ 319.479,42	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 87.856,84	R\$ 61.660,22	R\$ 26.196,62	R\$ 87.856,84	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:	R\$ 407.336,27	R\$ 285.879,21	R\$ 121.457,04	R\$ 407.336,26	R\$ 0,00

CHAPADINHA - MA 24/07/2026

Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA
VERAS:04230953313
Dados: 2026.07.29 13:21:52 -03'00'

VINICIUS ALMEIDA
VERAS:04230953313

VINICIUS ALMEIDA VERAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 042.309.533 -13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

VINICIUS ALMEIDA Assinado de forma digital
VERAS:042309533 por VINICIUS ALMEIDA
VERAS:042309533313
13 Dados: 2026.07.29
16:07:07 -03'00'



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



FUNDAÇÃO




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

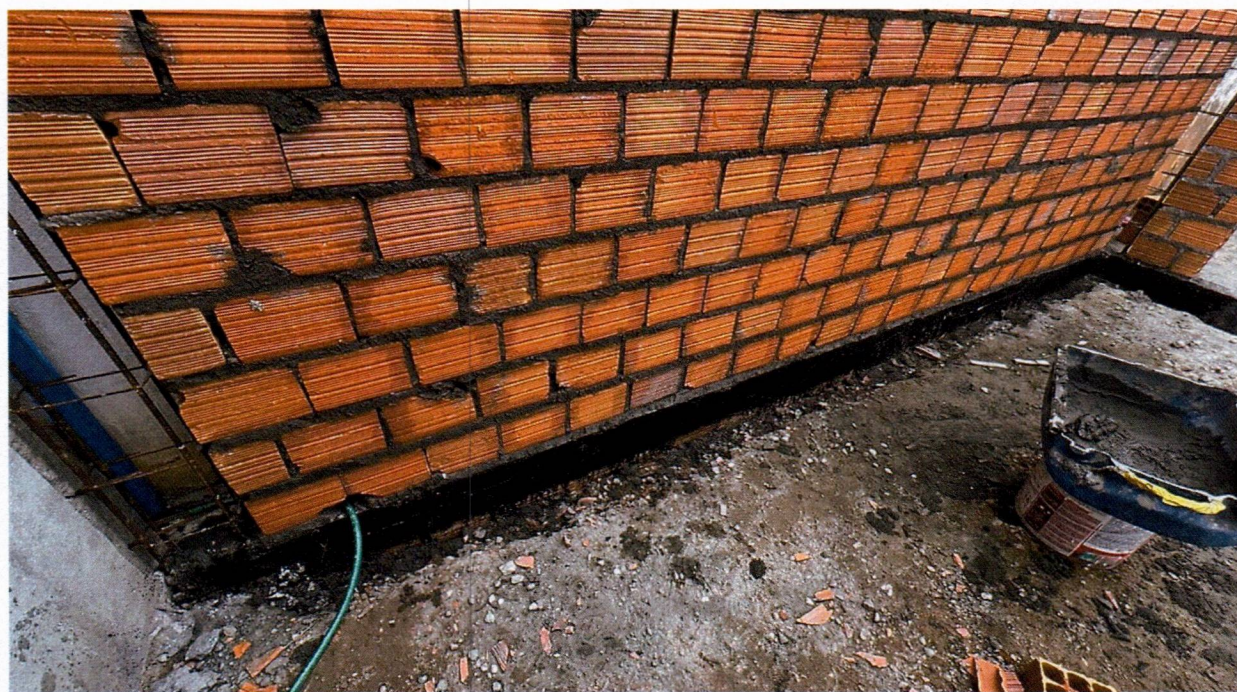

EXECUÇÃO FUNDAÇÃO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO ALVENARIA




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

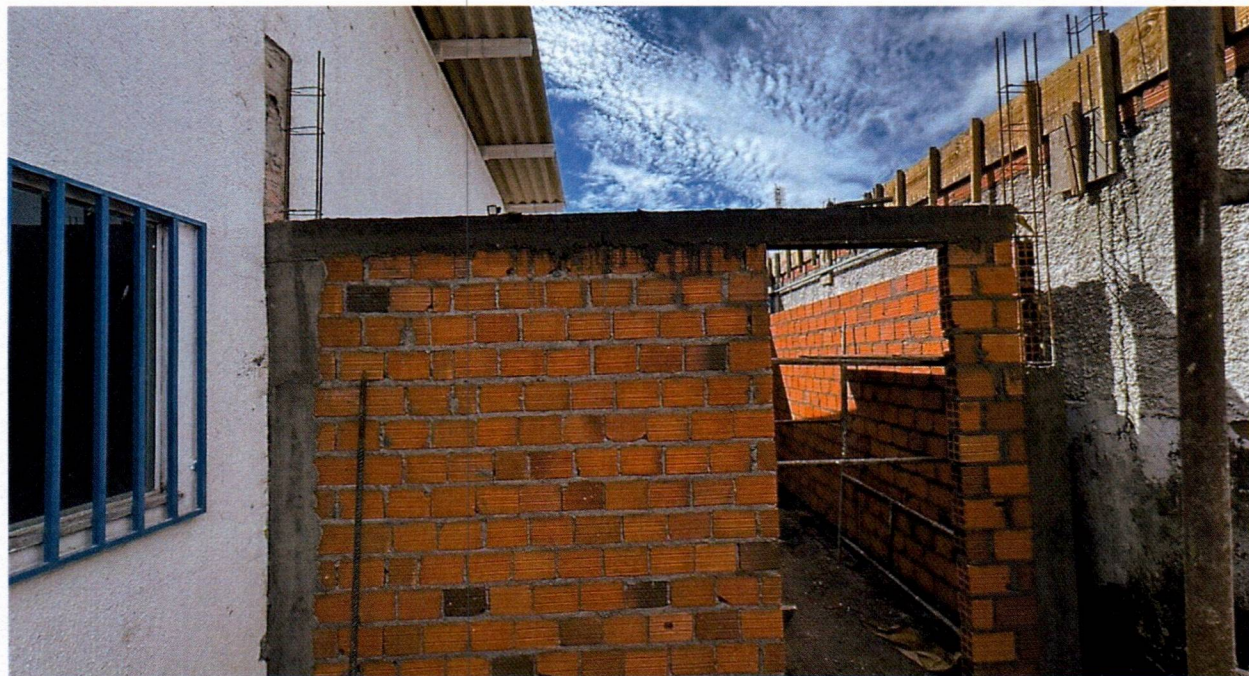

EXECUÇÃO PILARES/VIGAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PILARES E VIGAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO CHAPISCO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO CHAPISCO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO ATERRO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO CONTRAPISO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO REBOCO




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

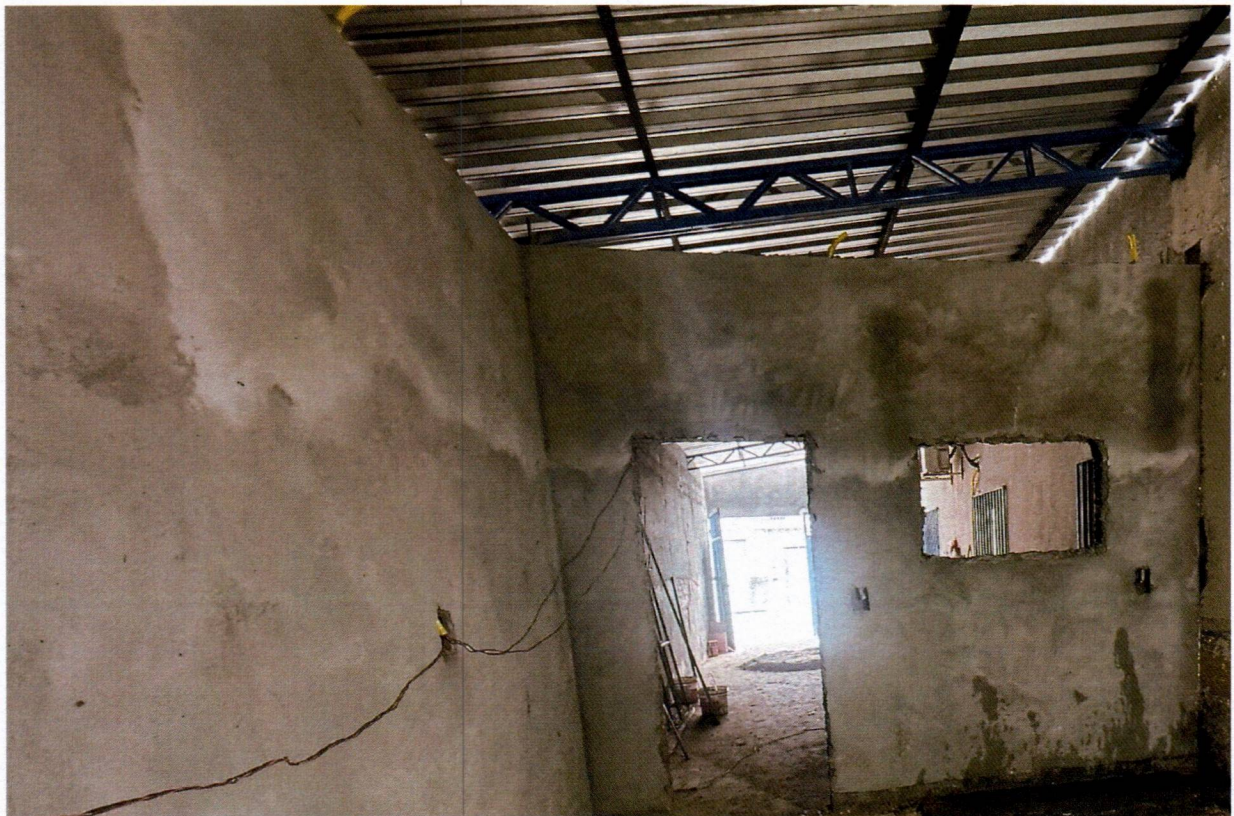

EXECUÇÃO REBOCO




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

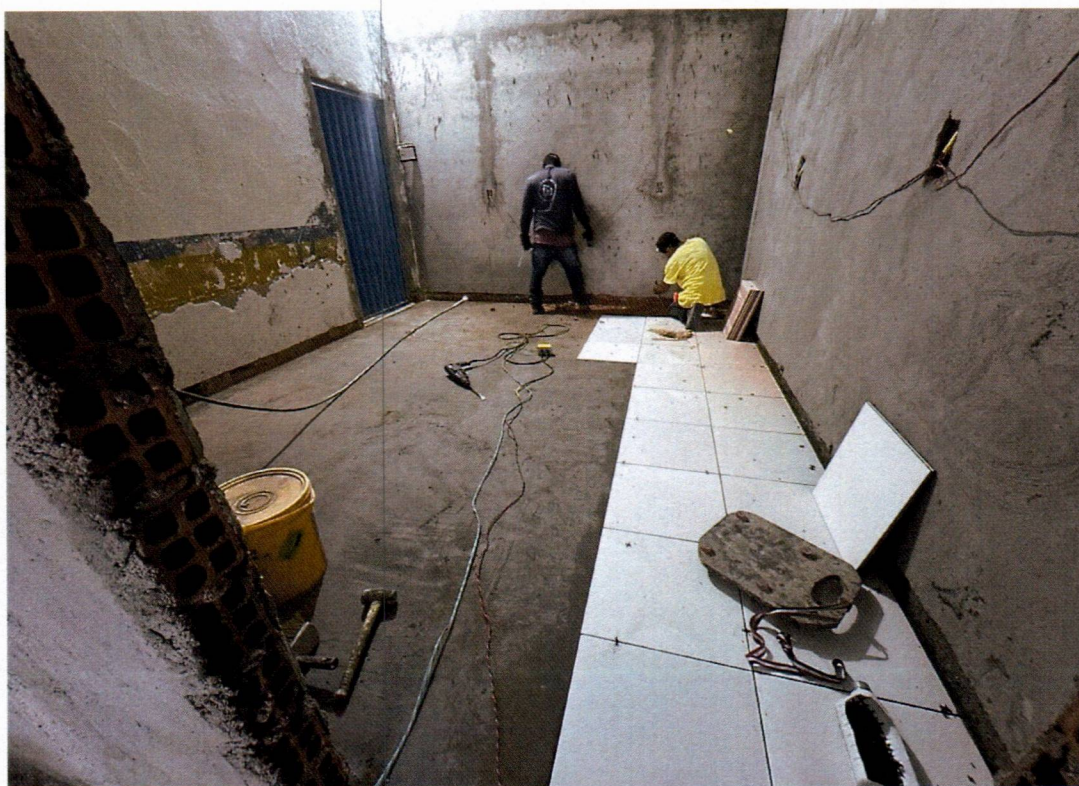

EXECUÇÃO PISO CERAMICO




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

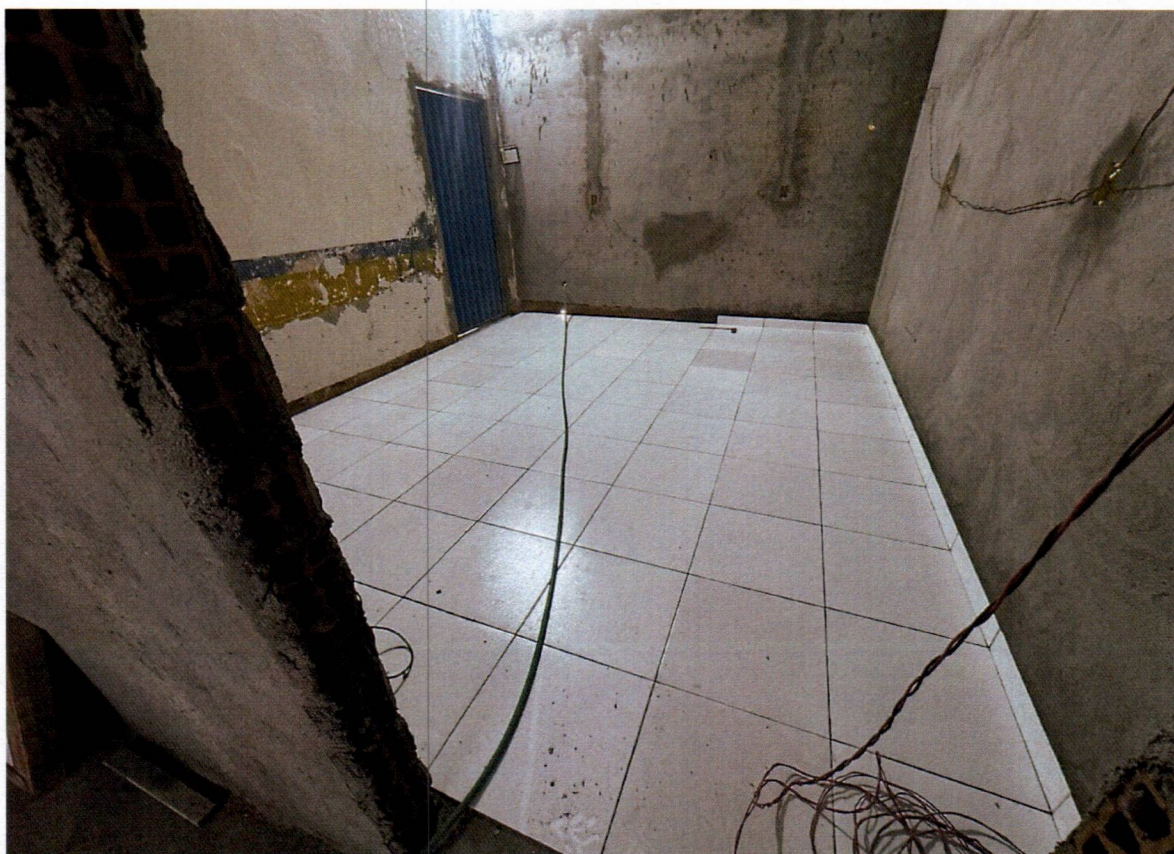

EXECUÇÃO PISO CERAMICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PORTA/ JANELA COM PEITORIL



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PORTA / JANELA COM PEITORIL



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO FORRO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO FORRO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PINTURA FACHADA E CALÇADA EXTERNA



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PINTURA FACHADA E CALÇADA EXTERNA



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PINTURA EXTERNA FUNDO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



EXECUÇÃO PINTURA EXTERNA LATERAL




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

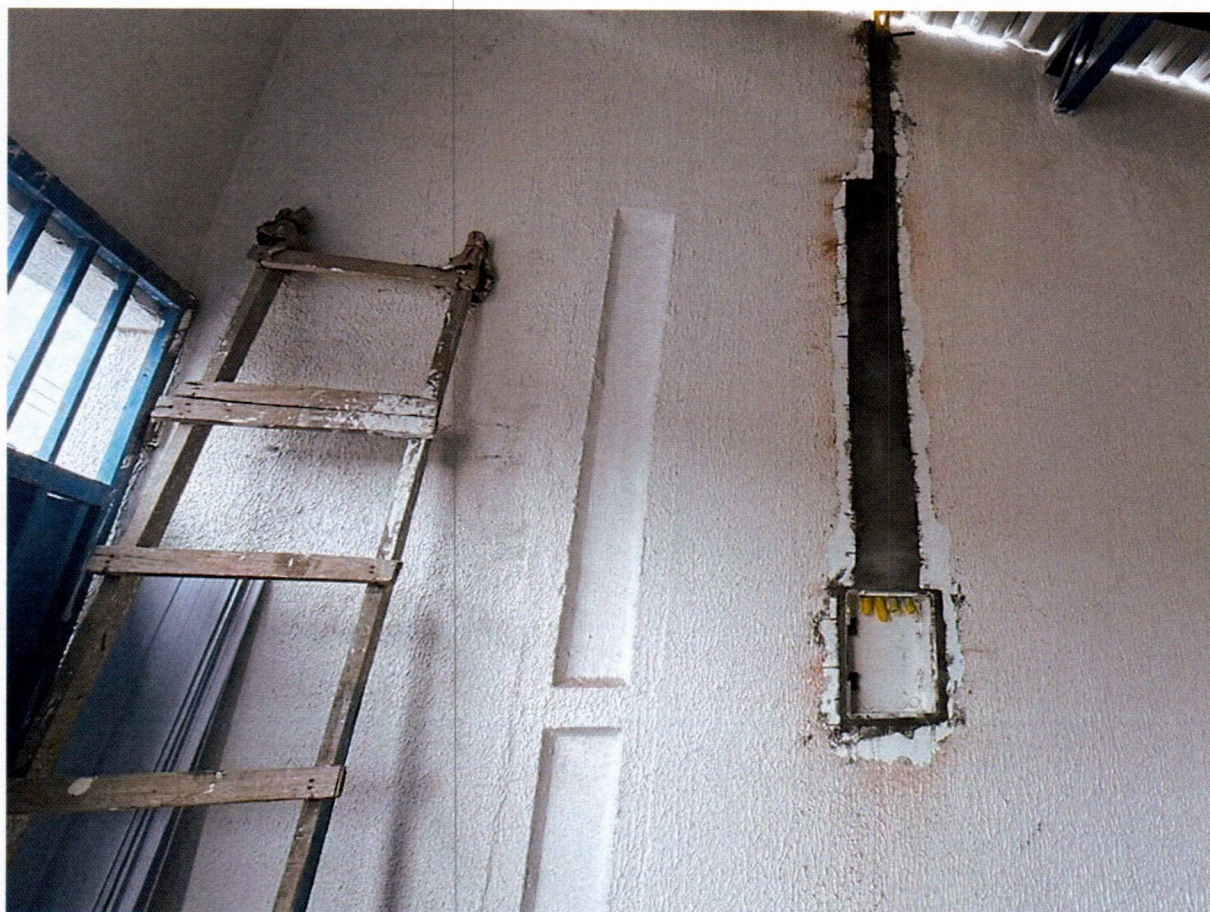

EXECUÇÃO QUADRO ELÉTRICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA



EXECUÇÃO QUADRO ELÉTRICO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 330/2024

Medição: Terceira Medição

REFORMA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA



EXECUÇÃO TRINCO / PORTA

VINICIUS
ALMEIDA
VERAS:0423095
3313

Assinado de forma
digital por VINICIUS
ALMEIDA
VERAS:04230953313
Dados: 2026.07.29
16:07:52 -03'00'

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS														
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA					EMPRESA: IDL EMREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.513.233/0001-98									
CONCORRÊNCIA Nº: 040/2025					OBJETO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE FIBROCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.									
Nº DO CONTRATO: 097/2026					DATA: 10 DE JUNHO DE 2026									
PROCESSO ADM.: 6229/2025					01º TERMO DE ADITIVO									
CONTRATADO					ADITIVO + SUPRESSÃO					CONTRATO + ADITIVO				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	CONSOLIDADO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ADITIVO	CONSOLIDADO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 750,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
1.1	11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	unid.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 10.188,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.188,00
2.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	360,00	R\$ 28,30	R\$ 10.188,00			360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.188,00
3		DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS					R\$ 3.483,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.483,35
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M²	444,36	R\$ 1,84	R\$ 817,62			444,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 817,62
3.2	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M²	575,86	R\$ 4,30	R\$ 2.476,20			575,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.476,20
3.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M²	19,32	R\$ 9,81	R\$ 189,53			19,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,53
4		ALVENARIA E VEDAÇÕES					R\$ 1.855,82				R\$ 8.748,88	R\$ -	R\$ 8.748,88	R\$ 10.604,70
4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	15,75	R\$ 117,83	R\$ 1.855,82	74,25		90,00	R\$ 8.748,88	R\$ -	R\$ 8.748,88	R\$ 10.604,70
		REVESTIMENTO EXTERNO					R\$ 1.346,32				R\$ 6.624,70	R\$ -	R\$ 6.624,70	R\$ 7.971,02
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M²	31,50	R\$ 4,65	R\$ 146,48	155,00		186,50	R\$ 720,75	R\$ -	R\$ 720,75	R\$ 867,23
5.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M²	31,50	R\$ 38,09	R\$ 1.199,84	155,00		186,50	R\$ 5.903,95	R\$ -	R\$ 5.903,95	R\$ 7.103,79
6		COBERTURA					R\$ 109.241,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.241,88
6.1	12718	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	ORSE	M²	627,28	R\$ 133,09	R\$ 83.484,70			627,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.484,70
6.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M²	71,36	R\$ 254,65	R\$ 18.171,82			71,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.171,82
6.3	12410	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC75X38X3,84, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS ATÉ 10,0M DE VÃO, LARGURA 0,50M, PDMAX. 7,00, PINTURA01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	ORSE	M	17,40	R\$ 435,94	R\$ 7.585,36			17,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.585,36
7		FORRO					R\$ 20.444,42				R\$ 14.905,06	R\$ -	R\$ 14.905,06	R\$ 35.349,48
7.1	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M²	266,62	R\$ 76,68	R\$ 20.444,42	194,38		461,00	R\$ 14.905,06	R\$ -	R\$ 14.905,06	R\$ 35.349,48

12.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M²	793,27	R\$ 15,32	R\$ 12.152,90			793,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.152,90
12.2		PINTURA EXTERNA					R\$ 9.806,06				R\$	1.240,67	R\$	-	R\$	1.240,67	R\$	11.046,73
12.2.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M²	517,47	R\$ 3,63	R\$ 1.878,42	97,00		614,47	R\$	352,11	R\$	-	R\$	352,11	R\$	2.230,53
12.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M²	517,47	R\$ 15,32	R\$ 7.927,64	58,00		575,47	R\$	888,56	R\$	-	R\$	888,56	R\$	8.816,20
12.3		ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 462,39				R\$	709,17	R\$	-	R\$	709,17	R\$	1.171,56
12.3.1	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M²	23,52	R\$ 15,67	R\$ 368,56	18,42		41,94	R\$	288,64	R\$	-	R\$	288,64	R\$	657,20
12.3.2	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M²	4,11	R\$ 22,83	R\$ 93,83	18,42		22,53	R\$	420,53	R\$	-	R\$	420,53	R\$	514,36
12.4		ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 1.899,86				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.899,86
12.4.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M²	38,02	R\$ 49,97	R\$ 1.899,86			38,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.899,86
13		SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.456,54				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.456,54
13.1.1	2450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M²	627,82	R\$ 2,32	R\$ 1.456,54			627,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.456,54
21		SERVIÇOS EXTRACONTRATUAL					R\$ -				R\$	37.028,74	R\$	-	R\$	37.028,74	R\$	37.028,74
21.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M³		R\$ 109,91		1,27		1,27	R\$	139,59	R\$	-	R\$	139,59	R\$	139,59
21.2	C3104	REMOÇÃO DE CERCASREMOÇÃO DE CERCA CONCERTINA	SEINFRA	M		R\$ 0,45		24,20		24,20	R\$	10,99	R\$	-	R\$	10,99	R\$	10,99
21.3	S00017	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	ORSE	M²		R\$ 9,13		18,00		18,00	R\$	164,38	R\$	-	R\$	164,38	R\$	164,38
21.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M²		R\$ 7,29		130,00		130,00	R\$	947,20	R\$	-	R\$	947,20	R\$	947,20
21.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M³		R\$ 31,76		72,00		72,00	R\$	2.286,78	R\$	-	R\$	2.286,78	R\$	2.286,78
21.6	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN		R\$ 215,45		1,00		1,00	R\$	215,45	R\$	-	R\$	215,45	R\$	215,45
21.7	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M		R\$ 12,12		105,00		105,00	R\$	1.273,00	R\$	-	R\$	1.273,00	R\$	1.273,00
21.8	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M		R\$ 8,04		300,00		300,00	R\$	2.410,94	R\$	-	R\$	2.410,94	R\$	2.410,94
21.9	S01756	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN		R\$ 706,81		1,00		1,00	R\$	706,81	R\$	-	R\$	706,81	R\$	706,81
21.10	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN		R\$ 33,34		3,00		3,00	R\$	100,02	R\$	-	R\$	100,02	R\$	100,02
21.11	S02022	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	ORSE	UN		R\$ 68,99		8,00		8,00	R\$	551,93	R\$	-	R\$	551,93	R\$	551,93
21.12	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 12,83		10,00		10,00	R\$	128,35	R\$	-	R\$	128,35	R\$	128,35
21.13	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M		R\$ 20,21		6,00		6,00	R\$	121,26	R\$	-	R\$	121,26	R\$	121,26
21.14	S01677	TÊ 90º EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	ORSE	UN		R\$ 12,16		1,00		1,00	R\$	12,16	R\$	-	R\$	12,16	R\$	12,16
21.15	1967	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN		R\$ 5,96		1,00		1,00	R\$	5,96	R\$	-	R\$	5,96	R\$	5,96

21.16	503298	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	ORSE	PT		R\$ 223,26		13,00				13,00	R\$ 2.902,43	R\$ -	R\$ 2.902,43	R\$ 2.902,43
21.17	512223	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	ORSE	UN		R\$ 362,15		1,00					R\$ 362,15	R\$ -	R\$ 362,15	R\$ 362,15
21.18	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN		R\$ 76,10		4,00					R\$ 304,40	R\$ -	R\$ 304,40	R\$ 304,40
21.19	C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN		R\$ 76,10		3,00					R\$ 228,30	R\$ -	R\$ 228,30	R\$ 228,30
21.20	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN		R\$ 86,49		4,00					R\$ 345,94	R\$ -	R\$ 345,94	R\$ 345,94
21.21	513682	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	ORSE	UN		R\$ 150,06		5,00					R\$ 750,28	R\$ -	R\$ 750,28	R\$ 750,28
21.22	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M²		R\$ 274,29		16,71					R\$ 4.583,32	R\$ -	R\$ 4.583,32	R\$ 4.583,32
21.23	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M²		R\$ 26,19		58,00					R\$ 1.519,17	R\$ -	R\$ 1.519,17	R\$ 1.519,17
21.24	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M²		R\$ 16,53		227,00					R\$ 3.751,65	R\$ -	R\$ 3.751,65	R\$ 3.751,65
21.25	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M²		R\$ 23,67		258,60					R\$ 6.122,35	R\$ -	R\$ 6.122,35	R\$ 6.122,35
21.26	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M²		R\$ 718,17		1,20					R\$ 861,80	R\$ -	R\$ 861,80	R\$ 861,80
21.27	S02266	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	ORSE	M		R\$ 90,27		1,68					R\$ 151,65	R\$ -	R\$ 151,65	R\$ 151,65
21.28	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (VIGA BALDRAME E SUPERIOR)	SINAPI	KG		R\$ 15,91		61,62					R\$ 980,07	R\$ -	R\$ 980,07	R\$ 980,07
21.29	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (VIGA BALDRAME E SUPERIOR)	SINAPI	KG		R\$ 19,69		25,87					R\$ 509,29	R\$ -	R\$ 509,29	R\$ 509,29
21.30	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (VIGA BALDRAME E SUPERIOR)	SINAPI	M³		R\$ 545,60		1,33					R\$ 725,65	R\$ -	R\$ 725,65	R\$ 725,65
21.31	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M³		R\$ 297,35		1,33					R\$ 395,47	R\$ -	R\$ 395,47	R\$ 395,47
21.32	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²		R\$ 43,96		5,40					R\$ 237,40	R\$ -	R\$ 237,40	R\$ 237,40
21.33	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 10,97		29,62					R\$ 324,89	R\$ -	R\$ 324,89	R\$ 324,89
21.34	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG		R\$ 13,96		9,24					R\$ 128,99	R\$ -	R\$ 128,99	R\$ 128,99
21.35	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M³		R\$ 545,60		0,42					R\$ 229,15	R\$ -	R\$ 229,15	R\$ 229,15
21.36	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M³		R\$ 297,35		0,42					R\$ 124,89	R\$ -	R\$ 124,89	R\$ 124,89

21.37	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M³	R\$ 79,13				4,00				4,00	R\$	316,52	R\$	-	R\$	316,52	R\$	316,52
21.38	93187	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	R\$ 77,77				2,60				2,60	R\$	202,20	R\$	-	R\$	202,20	R\$	202,20
21.39	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M³	R\$ 449,66				0,85				0,85	R\$	382,21	R\$	-	R\$	382,21	R\$	382,21
21.40	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	R\$ 71,78				19,00				19,00	R\$	1.363,73	R\$	-	R\$	1.363,73	R\$	1.363,73
21.41	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	R\$ 10,00				15,00				15,00	R\$	150,02	R\$	-	R\$	150,02	R\$	150,02
22	SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO																				
22.1	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	R\$ 63,80				44,00				44,00	R\$	2.807,11	R\$	-	R\$	2.807,11	R\$	2.807,11
22.2	C4786	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	R\$ 184,45				11,00				11,00	R\$	2.028,99	R\$	-	R\$	2.028,99	R\$	2.028,99
22.3	S11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	M	R\$ 15,34				136,00				136,00	R\$	2.086,56	R\$	-	R\$	2.086,56	R\$	2.086,56
22.4	S11506	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	ORSE	M	R\$ 6,25				20,00				20,00	R\$	124,99	R\$	-	R\$	124,99	R\$	124,99
22.5	S11508	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2"	ORSE	M	R\$ 6,76				33,00				33,00	R\$	223,17	R\$	-	R\$	223,17	R\$	223,17
22.6	I09635	FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO 50MM X 30M	ORSE	UN	R\$ 15,01				6,00				6,00	R\$	90,04	R\$	-	R\$	90,04	R\$	90,04
					VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 224.219,01														
					VALOR BDI TOTAL:		R\$ 61.660,23														
					VALOR TOTAL:		R\$ 285.879,24														
										VALOR DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO: R\$ 121.457,04 (CENTO E VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)											

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA



A Sra.
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através do seu sócio proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO, CPF 825.214.653-15, RG 888297980**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 121.457,04** (CENTO E VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) referente a reforma e substituição do telhado de fibrocimento da secretaria municipal de segurança publica, defesa social e transito do municipio de chapadinha - MA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 27 de JULHO de 2026

THOMPSON
BEZERRA
CARNEIRO
SOBRINHO:845214
65315

Assinado de forma
digital por THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.07.29
13:35:02 -03'00'

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000091

Data e Hora da Emissão
27/07/2026 10:56:48

Competência da NFS-e
07/2026

Código de Verificação
3E4D.0231.5B5F.E8A8.5A40.1155.E9EB.FA74



Chave de Acesso da NFS-e
2111300120051323300019800000000009126074559979876

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98** Inscrição Municipal: **550000**

Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE, 3 - BAIRRO RENASCENÇA - CEP:**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **direcao@idealconstrutorama.** Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, 310 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA** UF: **MA** Email: **nickmacklewre@gmail.com** Telefone: **(98) 91660182**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE FIBROCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA. CONTRATO 097/2026.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	72.874,22	72.874,22
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	48.582,82	48.582,82

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,2000%):
R\$ 1.457,48

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):
R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,05%):
R\$ 57,69

CBS (0,45%):
R\$ 519,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.457,04

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 121.457,04	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 6.072,85
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**

Recolhimento: **RETIDO**

Atividade: **439919900 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

NBS: **101053000 - Serviços de construção de telhados e coberturas e serviços de**

Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM **27 / 07 / 2026**

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2026 a 04/08/2026

Certificação Número: 2026070602130036292078

Informação obtida em 17/07/2026 12:27:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão nº: 9922119/2026
Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:05:53 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2026.

Código de controle da certidão: **5085.643C.6C55.40FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 138472/26

Data da

03/06/2026 10:56:16

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 14:26:47



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056716/26

Data da 03/06/2026 10:57:42

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 14:27:53



CERTIFICADO

1020260092198722



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014117912026

Validade: 02/01/2027

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 00.513.233/0001-98		Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE		
Número: 3		Complemento:
Bairro: RENASCENCA		
Município: SAO LUIS – MA		CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de julho de 2026 as 14:00**, sob o código de autenticidade nº **CED6485EB1F6AABC0C0D9D0D2D636986**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2026
CONCORRÊNCIA Nº 040/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3125/2026 APENSO AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 6229/2025**

Aos **22 de Junho de 2026**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas, 310- Centro- Chapadinh/MA representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. Nº 755.788.833-20, residente nesta cidade doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA** estabelecida na Rua das Juçaras, Cd Executive Lake nº3, Sala 402- Renascença, São Luis-MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001-98**, através do seu sócio proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF 825.214.653-15, RG 888297980, doravante designada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO do Contrato Administrativo nº 097/2026**, decorrente da Concorrência nº 040/2025, oriundo do Proc. Administrativo nº 6229/2025, com fundamento no art. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2026, mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o **acréscimo quantitativo e financeiro** do contrato original, referente à **Contratação de Empresa especializada para serviços de reforma e substituição do telhado de fibrocimento da Secretaria Municipal de Segurança Pública do município de Chapadinh/MA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DE VALOR

Fica acrescido ao valor originalmente contratado o percentual de **42,49% (Quarenta e dois virgula quarenta e nove por cento)**, resultando em acréscimo financeiro de **R\$ 121.457,04 (Cento e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos)**, nos termos do art. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

O prazo de vigência deste Termo de Aditivo, com início na data de assinatura, permanecendo inalteradas as demais condições pactuadas do referido contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

1.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 02.33.00 - Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Social e Trânsito;
Projeto/Atividade: 06.181.0003.2011.0000 - Manutenção da Guarda Municipal; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 097/2026, que não tenham sido expressamente modificadas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial, conforme determina a legislação vigente.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor.

Chapadinho/MA, 22 de Junho de 2026.


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO

Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana

THOMPSON

BEZERRA CARNEIRO

SOBRINHO:8452146

5315

Assinado de forma digital

por THOMPSON BEZERRA

CARNEIRO

SOBRINHO:84521465315

Dados: 2026.07.27

18:02:38 -03'00'

IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Thompson Bezerra Carneiro Sobrinho

Representante Legal

CONTRATADA
