




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 886192/2023
 Emissão: 09/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 9d5y6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
 Registro: 1104806916
 CPF: 003.***.***-75

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 22/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS
 Data de Formação: 14/09/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
 Registro: 0000012183
 CNPJ: 07.737.378/0001-11
 Data Início: 28/05/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: COREL CONSTRUÇÕES, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA
 Registro: 0000006290
 CNPJ: 04.971.705/0001-07
 Data Início: 14/06/2013
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A. CLAUDINO DA SILVA
 Registro: 0005370167
 CNPJ: 05.572.919/0001-73
 Data Início: 06/10/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PRIMOS CONSTRUÇÕES LTDA
 Registro: 0000009711






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 886192/2023
Emissão: 09/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 9d5y6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 09.488.717/0001-07
Data Início: 06/04/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fls 0302
Proc. Nº 005/2023
Ass. [Signature]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112767755

M A

NOME: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

DDC IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 4304171 DGPC GO

CPF: 003.531.621-75 DATA NASCIMENTO: 15/06/1984

FILIAÇÃO: SEBASTIAO ALMEIDA DE CARVALHO
HI
SUELENE MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 03061871141 VALIDADE: 07/01/2024 1ª HABILITAÇÃO: 17/10/2003

OBSERVAÇÕES:

[Signature]
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 24/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
86753467002
MA043447660

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Large Signature]
[Signature]
[Signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Fls 0303

Proc. Nº 005/2023

Ass. [assinatura]

ART CARGO-FUNÇÃO
 Nº MA20180178565

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1104806916

Registro: 1104806916MA

2. Contratante

Contratante: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA**

RODOVIA BR-316

Complemento: **LOTE PV BARROCA FUNDA**

Cidade: **TIMON**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: 07.737.378/0001-11

Nº: s/n

Bairro: **BOA ESPERANÇA**

UF: **MA**

CEP: 65636849

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA**

RODOVIA BR-316

Complemento: **LOTE PV BARROCA FUNDA**

Cidade: **TIMON**

Data de Início: **28/05/2018**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função:

Previsão de término: **Não especificado**

Bairro: **BOA ESPERANÇA**

UF: **MA**

Nº: s/n

CEP: 65636849

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 003.531.621-75

Local _____ de _____ de _____
 data

**ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA -
 CNPJ: 07.737.378/0001-11**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 82,94**

Registrada em: **29/05/2018**

Valor pago: **R\$ 82,94**

Nosso Número: **8301509679**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYbwD
 Impresso em: 20/05/2023 às 14:13:40 por: , ip: 200.25.37.76





CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA
Fone: (86) 9 9958-5899



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO

TIMON/MA, 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Prezados Senhores,

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, portador da Carteira de Identidade nº 0336735120072/SSP-MA, CPF nº 497.801.583-91, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.737.378/0001-11, INDICA o profissional, DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, engenheiro civil, CREA nº 1104806916, integrante permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico, nos serviços objeto da licitação referenciada.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391, c=BR, ou=CTM-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=cicageperotassa@gmail.com
Data: 2023.12.20 16:08:26 -03'00'

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ Nº 07.737.378/0001-11
ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
DIRETOR
CPF Nº 497.801.583-91

CONTRATO DE TRABALHO

Fls 0305
Proc. Nº 005/2023

CONTRATANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA S/A estabelecida RODOVIA BR-316, KM 17, s/n, LOTE PV BARROCA FUNDA, BOA ESPERANÇA, TIMON (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 07.737.378/0001-11, denominada contratante, neste ato representado por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0336735120072/SSP/MA e do CPF nº 497.801.583-91, residente e domiciliado na Rodovia BR-226, Jóia, cond. Vilagem Jóia, Quadra ARQ - Lote 11/12, TIMON - MA.

CONTRATADO: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1104806916, inscrito no CPF sob o nº 003.531.621-75 e Carteira de Identidade nº 4304171-SSP/MA, domiciliado na Rodovia MA 230, 1768, Boa Vista, Chapadinha - Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá até o quinto dia útil de cada mês, para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, a título de remuneração mensal, a quantia de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), conforme o estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato estende-se por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Chapadinha, 28 de maio de 2018.

Assinado digitalmente por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391, c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=ccagapierosaa@gmail.com, data:2023.11.18 08:10:32 +03'00'

Antonio de Oliveira Monteiro
CONTRATANTE

DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO:00353162175

Assinado de forma digital por DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO:00353162175
Dados: 2023.05.20 14:21:24 -03'00'

Diogo Moreira Almeida de Carvalho
CONTRATADO

Testemunhas:

ges de mona C. B. A. Carvalho CPF.: 027337663-25

Quivaldo Lima Araújo CPF.: 124.368.523-91



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Fls 0306
Proc. Nº 005/2023

Nº 301279/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 7CcAy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE DE CASTRO COSTA
Registro: 0617154600
CPF: 045.***.***-79

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 30/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 23/01/2018

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: FACULDADE ATENEU
Data de Formação: 25/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA
ASS.

Fls 0307
 Proc. Nº 005/2023
 ART CARGO-FUNÇÃO
 Nº MA20210434660

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210434456

1. Responsável Técnico

FELIPE DE CASTRO COSTA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**
 RNP: 0617154600
 Registro: 116025MA

2. Contratante

Contratante: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**
RODOVIA BR-316
 Complemento: _____ Bairro: **BOA ESPERANÇA**
 Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65636849**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RODOVIA BR-316
 Complemento: _____ Bairro: **BOA ESPERANÇA**
 Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65636849**
 Nº: **S/M**
 Data de Início: **04/01/2021** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA EMPRESA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

FELIPE DE CASTRO COSTA - CPF: 845.384.663-79

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - CNPJ: 07.737.378/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **09/07/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9450C
 Impresso em: 10/10/2023 às 11:18:47 por: , ip: 192.168.100.1



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fis 0308
Proc. Nº 005 / 2023
Ass. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1668427301

CE

NOME
FELIPE DE CASTRO COSTA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
20088679168 SPDS CE

CPF
095.384.663-79

DATA NASCIMENTO
15/02/1995

FILIAÇÃO
MANOEL TOMAZ DA COSTA FILHO
FRANCISCA VALDELICE DE CASTRO COSTA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06024044897

VALIDADE
27/12/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/03/2014

OBSERVAÇÕES

União de Polícia

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LIMOEIRO DO NORTE, CE

DATA EMISSÃO
10/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40424801356
CE168554640

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Nome Civil: **FELIPE DE CASTRO COSTA**

CPF: **045.384.663-79**

Data de Nascimento: **15/02/1995**

Data de emissão: **25/02/2021**

Fls **0309**

Proc. Nº **005/2023**

Ass.

Contratos de Trabalho

- 24/08/2022 - Aberto

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ RAIZ: 7737378

Endereço: **ROD BR-316 SN LOTE PV BARROCA FUNDA**

Ocupação **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 3.906,00**

Remuneração inicial: **R\$ 3.636,00**

Última remuneração informada: **R\$ 3.906,00 (08/2023)**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

01/01/2023 - Salário alterado para R\$ 3.906,00


01/01/2023 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado

24/08/2022 - Admissão

Observações: -



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA
Fone: (86) 9 9958-5899



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO

TIMON/MA, 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

A
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Prezados Senhores,

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, portador da Carteira de Identidade nº 0336735120072/SSP-MA, CPF nº 497.801.583-91, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.737.378/0001-11, INDICA o profissional, FELIPE DE CASTRO COSTA, engenheiro civil, CREA nº 0617154600, integrante permanente dos serviços na condição de profissional responsável técnico, nos serviços objeto da licitação referenciada.

Atenciosamente,

ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391, c=BR,
o=CP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=olcageperotassa@gmail.com
Date: 2023.12.20 16:08:35 -03'00'

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ Nº 07.737.378/0001-11
ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
DIRETOR
CPF Nº 497.801.583-91



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


896445/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE DE CASTRO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE DE CASTRO COSTA**
Registro: **116025MA** RNP: **0617154600**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20220562403** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2022 Baixada em: 07/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 289/2022 Celebrado em: 29/07/2022
Valor do contrato: R\$ 4.150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA Nº: S/N
Complemento: Bairro: URBANO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Coordenadas Geográficas: 4.151827, 42.945409
Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 29/07/2023
Finalidade: CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 37735.20 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 8000.00 metro;**

Observações
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 37.735,20 M², NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº289/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896445/2023
17/11/2023, 09:18
3zxyW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3zxyW



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 09:21.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.737.378/0001-11, Inscrição Estadual nº. 12.224.975-5, com sede na Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão CEP 65.636-849, executou o serviço de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 288/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP.**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: Felipe de Castro Costa
- Título do Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho
- N°. Registro Nacional do Profissional: 691718466
- Empresa Executora dos serviços: **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**
- CNPJ: 07.737.378/0001-11
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: 06.117.786/0001-68
- Endereço da Obra: **SETOR URBANO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA CEP: 65600-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: MA20220663403
- Período do serviço: 01/08/2022 a 28/07/2023

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em concreto, pintura de meio fio, sinalização.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896445/2023, em 17/11/2023 em



Certidão nº 896445/2023
17/11/2023, 09:21

Chave de impressão: 3zyxw


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2023 e contém 4 folhas



Fls 0313

Página 3/5

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	9.056,49
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	37.735,20
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	181.126,96
2.1.4	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	9.056,49
2.1.5	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	M3	9.433,80
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	181.126,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896445/2023, em 17/11/2023 em




Certidão nº 896445/2023
17/11/2023, 09:21

Chave de Impressão: 3zyW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2023 e contém 4 folhas



Fis 0314
 Proc. Nº 005/2023
 Ass. [Assinatura]



2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 20CM E ESP: 3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	37.735,20
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	37.735,20
2.2.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	4.528,22
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T00M). AF_07/2020	T00M	90.564,48
2.3	DRENAGEM		
2.3.1	GUIA DE CONCRETO - MFC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	16.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SAIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	16.000,00
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF 05/2021	M	16.000,00
2.3.4	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - Ø = 1.000 MM	M	189,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 2CM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	14.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	14.000,00
3.1.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	T	1.680,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896445/2023, em 17/11/2023 em




Certidão nº 896445/2023
 17/11/2023, 09:21
 Chave de Impressão: 3zxyw

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2023 e contém 4 folhas



Fls 0315
 Proc. Nº 005/2023
 Ass. [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	33.600,00
4.0	SINALIZAÇÃO		
4.1	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	5430,00
4.2	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	UND	4232,00

Chapadão, 01 de novembro de 2023.

[Assinatura]
 Edvaldo Paz Nunes
 CREA-MA nº 110.313.774-3
 Engenheiro Civil - CREA-MA nº 110.313.774-3
 CPF: 508.273.833-04

[Assinatura]
 Raimundo Carlos da Silva Filho
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF: 755.768.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896445/2023, em 17/11/2023 em



Certidão nº 896445/2023
 17/11/2023, 09:21

Chave de Impressão: 3zyyW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


896340/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
 Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

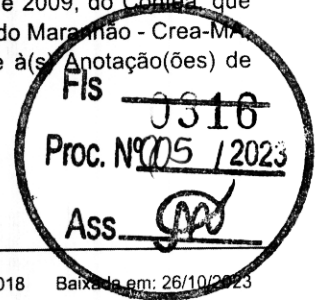

Número da ART: **MA20180203788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2018 Baixa em: 26/10/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
 Contrato: 131/2018 Celebrado em: 04/06/2018
 Valor do contrato: R\$ 1.193.998,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Bairro: CENTRO
 Complemento: UF: MA CEP: 65500000
 Cidade: Chapadinha
 Data de início: 08/06/2018 Conclusão efetiva: 06/06/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 534.02 tonelada**; 1 - **ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2006.90 metro**; 1 - **ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2006.90 metro**; 1 - **ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 400.93 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 3.44 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 7265.56 metro quadrado**;

Observações
 EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA. CONFORME O PROJETO BÁSICO (CONTRATO Nº 131/2018).

Informações Complementares
 • O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.1, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896340/2023
 08/11/2023, 13:06
 ZDZ57

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: ZDZ57



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA. CONFORME O PROJETO BÁSICO (CONTRATO Nº 131/2018). CONVÊNIO nº 820260/2018 – MINISTÉRIO DO TURISMO

ART. OBRA/SERVIÇO: Nº **MA20180203788** SUBSTITUIÇÃO À MA20180183509

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Pres. Vargas, s/n - Centro, Chapadinho - MA, CEP: 65500-000

Período de Execução: Início: **08/06/2018**. Previsão de Término: **06/06/2023**.

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58. END: Av. Pres. Vargas, 310 - Centro, Chapadinho - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), TERRAPLENAGEM (100%), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (100%), DRENAGEM SUPERFICIAL (100%), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (100%), SINALIZAÇÃO (100%), PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (100%), URBANIZAÇÃO (100%), LIMPEZA GERAL DA OBRA (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001-58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA – ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: **1104806916MA** CREA/MA. Período de Participação na Obra: 08/06/2018 a 06/06/2023.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA COM AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DREGANEGEM, SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896340/2023, em 08/11/2023 em
emitida



Certidão nº 896340/2023
08/11/2023, 14:37

Chave de Impressão: ZDZ57

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 3 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Placa Identificativa da obra	m ²	
1.2	Raspagem e limpeza de terreno	m ²	15.429,33
1.3	Locação da Obra	m ²	15.429,33
1.4	Demolição de calçada existente	m ³	330,55
1.5	Demolição de meio fio existente	m ³	62,61
1.6	Demolição de sarjeta existente	m ³	500,91
1.7	Transporte mat. e bota fora DMT=6,00km	m ³ xkm	7.241,97
2 TERRAPLANAGEM			
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	15.429,33
2.2	Raspagem e limpeza do terreno - área de jazida	m ²	15.429,33
2.3	Escavação e carga de material de jazida	m ³	3.857,33
2.4	Transporte local basic. 6m3 em rodov. Pav. 20,0 km	m ³ xkm	65.574,61
2.5	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. categoria	m ³	3.857,33
2.6	Sub-base estabilizada granulometricamente s/ mistura de material	m ³	3.085,87
2.7	Base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura	m ³	3.085,87
3 PAVIMENTAÇÃO			
3.1	Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30	m ²	15.429,33
3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m ²	13.465,42
3.3	Concreto asfalto usinado a quente (C.B.U.Q.)	t	989,71
3.4	Transporte de CBUQ	t x km	10.223,70
3.5	Calçada em concreto simples e=7,0cm	m ²	2.080,91
4 DRENAGEM			
4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,45 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3:5 (cimento e areia)	m	2.145,00
4.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40 cm	m	2.145,00
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
5.1	Alça Preformado de Distribuição, em Aço Galvanizado, para Cabo	und	15,00
5.2	Armação Secundária, com 1 Estribo, sem Isolador	und	35,00
5.3	Arruela Quadrada em Aço Galvanizado, dimensão=38 mm	und	150,00
5.4	Braço para Iluminação Pública, em tubo de Aço Galvanizado, comprimento de 3m	und	71,00
5.5	Cabo de Cobre Nu 25 mm ²	m	50,00
5.6	Fornecimento de Cabo Multiplexado para Rede 2x1x16+16 mm ²	m	1.600,00
5.7	Cabo de Cobre PP 2x1,5mm ²	m	200,00
5.8	Conector Perfurante	und	144,00
5.9	Eletroduto de PVC Rígido Roscavel 3/4"	m	4,00
5.10	Grampo Metálico Tipo U Para de Haste de Aterramento	und	4,00
5.11	Haste de Aterramento em Aço com 3m de Comprimento e DN+ 5/8"	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896340/2023, em 08/11/2023 emitida em



Certidão nº 896340/2023
08/11/2023, 14:37
Chave de Impressão: ZDZ57

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 3 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.12	Isolador Tipo Roldana, para Baixa Tensão	und	35,00
5.13	Luminária de Lede para Iluminação Pública de 98 W até 137 W	und	71,00
5.14	Parafuso M16 em Aço Galvanizado, comprimento= 250 mm, diâmetro= 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	und	119,00
5.15	Parafuso M16 em Aço Galvanizado, comprimento= 300 mm, diâmetro= 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	und	48,00
5.16	Poste de Concreto Armado de Seção Circular Extensão de 9m Resistência de 200 a 300 Dan	und	30,00
5.17	Assentamento de Poste de Concreto de Seção Circular Extensão de 9m Resistência de 200 a 300 Dan	und	30,00
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1 Sinalização Horizontal			
6.1.1	Pintura de Faixa Longitudinal - largura = 0,12 m - Contínua	m2	432,45
6.1.2	Pintura de Faixa Longitudinal - largura = 0,12 m - Descontínua	m2	
6.1.3	Pintura de Faixa de Travessia de Pedestre: 0,40 m x 4,00 m x 8 unid	m2	
6.2 Sinalização Vertical			
6.2.1	Fornec. e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm).	m2	
6.2.2	Fornec. e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Regulamentação (D = 50cm) com suporte	m2	25,10
7 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			
7.1	Rampa para acesso de deficientes em concreto simples Fck=25Mpa com duas demãos de pintura indicativa	m2	12,00
7.2	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto na cor vermelha p deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.	m2	5,63
8 URBANIZAÇÃO			
8.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	682,00
9 LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9.1	Limpeza da obra	m²	8.654,46


Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Fiscal CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

CHAPADINHA- MA, 26 DE OUTUBRO DE 2023.


Raimundo Peres Silva Filho
Sec. Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12706

Raimundo Peres Silva Filho
Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896340/2023, em 08/11/2023 emitida



Certidão nº 896340/2023
08/11/2023, 14:37

Chave de Impressão: ZDZ57


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



REGISTRO DE ATESTADO

896345/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190309188** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2019 Baixada em: 25/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 192/2019 Celebrado em: 21/08/2019 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 221.613,60
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 29 DE MARÇO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CORRENTE
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Coordenadas Geográficas: -3.739605, -43.347825
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 06/07/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1815.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 615.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 615.00 metro; 1 - ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 66.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1815.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 29 DE MARÇO, ÁREA TOTAL DE 1.815,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA, CONFORME TP 009/2019-CPL/PMC CONVÊNIO N.866276/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896345/2023
14/11/2023, 08:55
CbCD7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea.ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CbCD7



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 29 DE MARÇO, ÁREA TOTAL DE 1.815,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA, CONFORME PROJETO BÁSICO (CONTRATO Nº 192/2019) CONVÊNIO Nº 866276/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

ART. OBRA/SERVIÇO: Nº **MA20190309188**

Período de execução: Início: **06/01/2020**. Previsão de Término: **06/07/2020**.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua 29 de março, s/n - Corrente, Chapadinho - MA, CEP: 65500-000

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58. END: Av. Pres. Vargas, 310 - Centro, Chapadinho - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), TERRAPLENAGEM (100%), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (100%), CALÇADAS (100%), DRENAGEM SUPERFICIAL (100%), SINALIZAÇÃO (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001-58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: **1104806916MA** CREA/MA. Período de Participação na Obra: 06/01/2020 a 06/07/2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM DREGANEGEM, SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896345/2023, em 14/11/2023 emitida




Certidão nº 896345/2023
17/11/2023, 09:39

Chave de Impressão: CbCD7

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**


	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	436,77
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Administração local	MÊS	6,00
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	Mobilização de equipamentos	UND	1,00
3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	805,20
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	644,20
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	805,20
4.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	423,42
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	2.752,25
4.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	423,42
5.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.815,00
5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.815,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896345/2023, em 14/11/2023 emitida

Certidão nº 896345/2023
17/11/2023, 09:39
Chave de Impressão: CbCD7

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	54,45
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	435,57
6.0	SERVIÇOS DE CALÇADAS		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	922,50
6.2	Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, para deficiente visual	M2	153,75
7.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	615,00
7.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	615,00
8.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.1	Confeção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,51
8.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00
9.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
9.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	66,00
10.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
10.1	Limpeza da obra	M2	3.003,00

CHAPADINHA- MA, 26 DE OUTUBRO DE 2023.

 Edvaldo Paz Nunes
 CREA/MA 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

 Edvaldo Paz Nunes
 Engenheiro Civil CREA/MA nº 110.313.774-3
 CPF: 508.273.833-04

 Raimundo Peres da Silva Filho
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 Matrícula: 12708

 Raimundo Peres da Silva Filho
 Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896345/2023, em 14/11/2023 emitida


 Certidão nº 896345/2023
 17/11/2023, 09:39

Chave de Impressão: CbCD7

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885843/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
 Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220536068** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2022 Baixada em: 09/06/2023
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65500000
 Cidade: Chapadinha
 Contrato: 190/2022 Celebrado em: 10/05/2022
 Valor do contrato: R\$ 4.150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: URBANO UF: MA CEP: 65500000
 Cidade: Chapadinha
 Coordenadas Geográficas: 4.151827, 42.945409
 Data de início: 12/05/2022 Conclusão efetiva: 10/05/2023
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 46264,80 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8000,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 8000,00 metro;**

Observações
 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 46.264,80 M², NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA, SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885843/2023
08/05/2023, 18:26
dBWa6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dBWa6



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 0325
Proc. Nº 005/2023
Ass. *[Signature]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.737.378/0001-11, Inscrição Estadual nº. 12.224.975-5, com sede na Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849, executou o serviço de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 190/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP.**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Diogo Moreira Almeida de Carvalho**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **110480691-6**
- Empresa Executora dos serviços: **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**
- CNPJ: **07.737.378/0001-11**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **SETOR URBANO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA CEP: 65500-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20220536068**
- Período do serviço: **12/05/2022 a 10/05/2023**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em concreto, pintura de meio fio, recapeamento asfáltico e recomposição de pavimento asfáltico.

[Handwritten signatures and marks]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023 emitida em



Certidão nº 885843/2023

15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dBWw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 0326
Proc. Nº 005/2023
Ass. *[Assinatura]*

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	7.743,55
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	32.264,80
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT 20KM (JAZIDA)	M3XKM	154.871,00
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.743,55
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8KM E ESP: 3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	32.264,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, emitida em 08/05/2023



Certidão nº 885843/2023

15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dBWag

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 0327

Proc. Nº 005/2023

Ass.

2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	32.264,80
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	967,95
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.359,00
2.3	DRENAGEM		
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF 05/2021	M	8.000,00
2.3.4	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM	M	189,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 4KM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	14.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	14.000,00
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	700,00
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF 07/2020	M3XKM	14.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023



Certidão nº 885843/2023

15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dBWla6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

0328
Fls _____
Proc. Nº 005/2023
Ass. *[Signature]*

4.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
4.1	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL.	M3	213,24
5.0	CONTENÇÃO DE TALUDE (ENCOSTAS)		
5.1	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	M3	2.568,90
5.2	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUIROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	863,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023 emitida



Chapadina, 13 de abril de 2023.

[Signature]
Edvaldo Paz Nunes
CREA/MA 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

[Signature]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

Certidão nº 885843/2023
15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dBWw6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas

4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867800/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis. 0329
Proc. Nº 005/2023
Ass. [Assinatura]

Número da ART: **MA20210450004** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **12/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 6.194.517,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **URBANO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, 42.945409**
Data de início: **13/08/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 91000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 10000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 10000.00 metro;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 91.000,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, CONCORRÊNCIA Nº 002/2021. PROCESSO ADM. Nº 0101.0175.2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867800/2022
04/07/2022, 17:07
WAB1c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/public/>, com a chave: WAB1c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 02/12/2022, às 07:43.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA. CONCORRÊNCIA 002/2021. CONTRATO Nº 001/2021.

ART. OBRA/SERVIÇO: Nº MA20210450004

Periodo Contratual: Início: 13/08/2021. Previsão de Término: 13/08/2022.

Periodo Executado: 13/08/2021 à 25/04/2022.

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58. END: Av. Pres. Vargas, 310 - Centro, Chapadinda - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), TERRAPLENAGEM (100%), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (100%), DRENAGEM SUPERFICIAL (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (82,48%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001-58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA – ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA. Período de Participação na Obra: 13/08/2021 a 13/08/2022.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 91.000,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, CONCORRÊNCIA 002/2021.
ART. OBRA/SERVIÇO Nº MA20210450004

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00

1

Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – CEP: 65500000 – CNPJ: 06.117.709/0001-58 – Chapadinda MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867800/2022, em 04/07/2022 emitida




Certidão nº 867800/2022
02/12/2022, 07:43

Chave de Impressão: WAB1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	8.400,00
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	35.000,00
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT 20KM (JAZIDA)	M3XKM	168.000,00
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8.400,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5KM E ESP: 3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	35.000,00
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	35.000,00
2.2.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	M3	1.050,00
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.000,00
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10.000,00
2.3.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	3.000,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 8KM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RÔAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	56.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	56.000,00
3.1.3	AREIA ASFÁLTICA À QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	2.800,00

2

Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – CEP: 65500000 – CNPJ: 06.117.709/0001-58 – Chapadina MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867800/2022, em 04/07/2022 emitida



Certidão nº 867800/2022

02/12/2022, 07:43

Chave de Impressão: WAB1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 0332
Proc. Nº 005 / 2023
Ass. *[Signature]*

3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.6000,00
-------	---	-------	-----------

CHAPADINHA- MA, 17 DE MAIO DE 2022.

[Signature]
Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes

Engenheiro Civil CREA/MA nº 110.313.774-3

CPF: 508.273.833-04

[Signature]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

Raimundo Peres Silva Filho

Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867800/2022, em 04/07/2022 emitida



CARTÓRIO - BOARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Reconheço por assinatura e firma de EDVALDO PAZ NUNES
Alex. Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder. Judicial - T.J.MA
Selo: RECFIR0299100A/00129/2022
Data/Hora: 20/05/2022 15:10:49, Abc: 13 17 2
Partes: EDVALDO PAZ NUNES, Total: R\$ 5,00 Emol: R\$ 5,14 FENC: R\$ 0,15 FADEP: R\$ 0,30 FEMP: R\$ 0,20
Consulte em: https://sicoj.trf4.jf.br

CARTÓRIO - COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SERVIDOR PÚBLICO

Reconheço por assinatura e firma de RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Alex. Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder. Judicial - T.J.MA
Selo: RECFIR5200111Z08CLOUQMDX0
Data/Hora: 20/05/2022 15:11:22, Abc: 13 17 2
Partes: RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO, Total: R\$ 5,00 Emol: R\$ 5,14 FENC: R\$ 0,15 FADEP: R\$ 0,30 FEMP: R\$ 0,20
Consulte em: https://sicoj.trf4.jf.br

3

Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – CEP: 65500000 – CNPJ: 06.117.709/0001-58 – Chapadina MA.

Certidão nº 867800/2022
02/12/2022, 07:43

Chave de Impressão: WAB1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/12/2022, às 07:43.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


799525/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

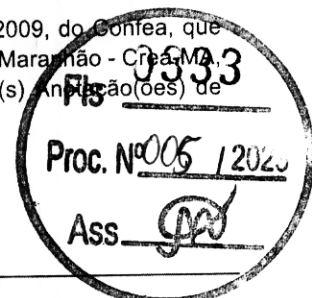

Número da ART: **00011048069165057110** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO ME**

Registrada em: **11/07/2016** Baixada em: **12/04/2018**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N. 310**
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 584.908,00**
Ação institucional: **Outros**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Endereço da obra/serviço: **SEDE DO MUNICIPIO**
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

Nº:
Bairro: **ZONA URBANA**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Data de início: **01/07/2016** Conclusão efetiva: **01/07/2017**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 9380.06 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 8652.96 M;**

Observações

SERVICO DE ENGENHARIA DE EXECUCAO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL, COM 8.652,96 M DE MEIO FIO E 9.380,06 M DE SARJETA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA- MA. CONTRATO N 128/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799525/2018
14/09/2018, 10:20
1350B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1350B





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Contratada ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.737.378/0001-11, com sede Rodovia BR 316, Lote PV Barroca Funda s/n, Bairro Boa Esperança, CEP 65.636-849 em Timon - MA, que tem como responsável técnico o Engenheiro Civil DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO de CREA nº 8017/DMA, RNP:110480691-6, executou serviço de drenagem superficial no município de Chapadinho - MA, conforme Contrato Nº 128/2016 e registrada na ART nº 00011048069165057110, em 01 de julho de 2016.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviço de engenharia de execução para drenagem superficial, com 8.652,96 m de meio fio e 9.380,06 m de sarjeta, na sede do município de Chapadinho- MA. Contrato nº 128/2016 ART. 00011048069165057110. Entre o período 01.07.16 à 01.07.17 PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Chapadinho CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58.

No qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:


Meio fio moldado in loco Fck = 15Mpa	m	8.652,96
Sarjeta em concreto p/ trecho urbano (e=6cm, L=30cm)	m	9.380,06
Pintura de meio fio - Hidracor 1 demão	m²	3.735,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 799525/2018, em 14/09/2018 emitida



Edvaldo dos Naves
CREA MA 110.318.774-3
Engenheiro Civil
2º OFÍCIO

Franci A. R. P.
CHAPADINHA-MA, 01 DE JULHO DE 2017.
2º OFÍCIO



Certidão nº 799525/2018
05/08/2019, 08:18
Chave de Impressão: 1350B

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885850/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA2022059757** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2022** Baixada em: **04/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **289/2022** Celebrado em: **29/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 4.150.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **URBANO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, 42.945409**
Data de início: **01/08/2022** Conclusão efetiva: **29/07/2023**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 37735.20 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 8000.00 metro;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 37.735,20 M², NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA. SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **885850/2023**
10/05/2023, 11:16
1Z92c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 1Z92c



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 07.737.378/0001-11, Inscrição Estadual n.º. 12.224.975-5, com sede na Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849, executou o serviço de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. DE ACORDO COM O CONTRATO N.º 289/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2022-SRP:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Diogo Moreira Almeida de Carvalho**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N.º. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **110480691-6**
- Empresa Executora dos serviços: **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**
- CNPJ: **07.737.378/0001-11**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **SETOR URBANO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA CEP: 65500-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n.º.: **MA20220559757**
- Período do serviço: **01/08/2022 a 29/07/2023**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em concreto, pintura de meio fio, recapeamento asfáltico e recomposição de pavimento asfáltico.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 885850/2023, em 10/05/2023 emitida




Certidão n.º 885850/2023
15/05/2023, 07:52

Chave de Impressão: 1Z92c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	5.696,45
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	23.735,20
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT 20KM (JAZIDA)	M3XKM	113.929,00
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.696,45
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8KM E ESP:3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	23.735,20
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	23.735,20


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, em 10/05/2023 emitida

Certidão nº 885850/2023
15/05/2023, 07:52

Chave de Impressão: 1Z92c

Este documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas





2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	712,05
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.241,00
2.3	DRENAGEM		
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF 05/2021	M	8.000,00
2.3.4	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM	M	192,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 4KM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	14.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	14.000,00
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	700,00
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF 07/2020	M3XKM	14.000,00
4.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, emitida em 10/05/2023



Certidão nº 885850/2023
15/05/2023, 07:52

Chave de Impressão: 1Z92c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



4.1	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL.	M3	213,24
5.0	CONTENÇÃO DE TALUDE (ENCOSTAS)		
5.1	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	M3	1175,55
5.2	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	685,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, emitida em 10/05/2023

Chapadina, 26 de abril de 2023.

[Assinatura]
Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil
Eng. Civil (Fiscal) CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

[Assinatura]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

[Assinatura]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20



Certidão nº 885850/2023
15/05/2023, 07:52

Chave de Impressão: 1Z92c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas

4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


844769/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180182154** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2018 Baixada em: 18/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 133/2018 Celebrado em: 04/06/2018
Valor do contrato: R\$ 1.794.232,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Data de início: 08/06/2018 Conclusão efetiva: 06/06/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2749.89 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 45.831,49 M² DE EXTENSÃO, COM 2.749,89 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: TERRA DURAS, CENTRO E CATERPILLAR, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.CONTRATO N 133/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 844769/2021
14/04/2021, 09:37
83YA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 83YA0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/04/2021, às 11:34.





Prefeitura Municipal de Chapadinda-MA
 CNPJ: CNPJ: 0. 117.709/0001-58
 End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadinda - MA
 Cep: 65.500-000.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINDA - MA, CONFORME CONTRATO - Nº 133/2018.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº MA20180182154

Período Obra/Serviço: Início 08/06/2018. Previsão de Término 06/06/2019.

DADOS CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA CNPJ: Nº 06.117.709/0001.58

END: Av. Pres. Vargas, S/N- Centro, Chapadinda - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM (100%), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA CNPJ: 06.117.709/0001.58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA. Período De Participação na Obra: 04/06/2018 a 06/06/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 45.831,49 M² DE EXTENSÃO, COM 2.749,89 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: TERRA DURAS, CENTRO E CATERPILLAR, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINDA/MA. CONTRATO N 133/2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844769/2021, em 14/04/2021 emitida



Certidão nº 844769/2021
 20/04/2021, 11:34

Chave de Impressão: 83YAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas


1
 Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadinda MA.

Digitalizado com CamScanner





Prefeitura Municipal de Chapadina-MA
 CNPJ: 0.117.709/0001-58
 End.: Rua Presidente Vargas, S/N. Centro, Chapadina - MA
 Cep: 65.500-000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844769/2021, em 14/04/2021



Certidão nº 844769/2021
 20/04/2021, 11:34
 Chave de Impressão: 83YAO
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL S/ BDI R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ -
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	234,12	295,20	R\$ -
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM						R\$ 1.402.311,73
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	45.831,49	1,35	1,70	R\$ 61.872,51
2.2	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE E=3CM	SINAPI	M3	1.374,94	478,36	603,16	R\$ 657.718,52
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM	SINAPI	M3	1.374,94	478,36	603,16	R\$ 657.718,52
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	TXKM	44.341,96	0,56	0,71	R\$ 25.002,17
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						R\$ 20.666,26
3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA -	SICRO	M2	13,31	291,79	367,91	R\$ 3.883,66
3.2	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN. -	SICRO	UND	11,00	158,20	199,48	R\$ 1.740,23
3.3	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92	SICRO	M2	648,39	22,39	28,23	R\$ 14.515,52
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UND	22,00	23,95	30,20	R\$ 526,84

Valor Orçamento (A): R\$ 1.422.977,98

Valor BDI (B): R\$ 371.254,96

Valor Total (A + B): R\$ 1.794.232,94

UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

CHAPADINHA-MA, 18 DE MARÇO DE 2021

Wanderlene Silva do Nascimento

Wanderlene Silva do Nascimento

Sec. Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Edvaldo Paz Nunes
 CREA-MA 110.313.714-3
 Engenheiro Civil

Eng. Civil Edvaldo Paz Nunes

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadina MA.

2

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


844775/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do ~~Confea~~ que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180182152** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2018 Baixada em: 18/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 132/2018 Celebrado em: 04/06/2018
Valor do contrato: R\$ 1.495.258,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Data de início: 08/06/2018 Conclusão efetiva: 06/06/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2239.50 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 37.325,03 M² DE EXTENSÃO, COM 2.239,50 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: APARECIDA E VILA ISAMARA EM CHAPADINHA-MA. CONTRATO N 132/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 844775/2021
14/04/2021, 09:26
ZW6Dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZW6Dw





Prefeitura Municipal de Chapadina-MA
CNPJ CNPJ 0 117.709/0001-58
End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadina - MA
Cep: 65.500-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, CONFORME CONTRATO - Nº 132/2018.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº **MA20180182152**

Período Obra/Serviço: Início **08/06/2018**. Previsão de Término **06/06/2019**.

DADOS CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001.58

END: Av. Pres. Vargas, S/N- Centro, Chapadina - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM (100%), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA **CNPJ:** 06.117.709/0001.58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME **CNPJ:** 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: **1104806916MA** CREA/MA. Período De Participação na Obra: 04/06/2018 a 06/06/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 37.325,03 M² DE EXTENSÃO, COM 2.239,50 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: APARECIDA E VILA ISAMARA EM CHAPADINHA-MA. CONTRATO N 132/2018.

1

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadina MA.

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844775/2021, em 14/04/2021 emitida

Certidão nº 844775/2021
20/04/2021, 11:37


Chave de Impressão: ZW6Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

CNPJ: CNPJ: 0.117.709/0001-58
End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadinha - MA
Cep: 65.500-000.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNIT R\$		PREÇO TOTAL S/ BDI R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.386,28
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	231,05	291,33	1.386,28
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM						1.161.595,00
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	37.325,03	1,35	1,71	50.526,89
2.2	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EXISTENTE ESP.=3CM	SINAPI	M3	1.119,75	478,30	603,09	535.582,33
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ESP.=3CM	SINAPI	M3	1.119,75	478,30	603,09	535.582,33
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	TXKM	72.223,94	0,55	0,70	39.903,45
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						22.884,59
3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	SICRO 02	M2	22,99	291,20	367,18	6.694,75
3.2	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.	SICRO 02	UND	19,00	158,20	199,48	3.005,85
3.3	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92	SICRO 02	M2	521,79	22,39	28,23	11.681,15
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UND	24,00	62,62	78,96	1.502,84
Valor Orçamento (A):							R\$ 1.185.865,87
Valor BDI (B):							R\$ 309.392,41
Valor Total (A + B):							R\$ 1.495.258,28
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CÊNTAVOS							
CHAPADINHA-MA, 18 DE MARÇO DE 2021							

Wanderlene Silva do Nascimento
Wanderlene Silva do Nascimento
Sec. Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Edvaldo Paz Nunes
Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
engenheiro Civil

Eng. Civil Edvaldo Paz Nunes

2

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadinha MA.

Digitallizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844775/2021, em 14/04/2021 emitida



Certidão nº 844775/2021
20/04/2021 11:37

Chave de Impressão: ZW6Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


844764/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
 Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180179319** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2018 Baixada em: 18/03/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
 Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 65500000
 Cidade: Chapadinha UF: MA
 Contrato: 107/2018 Celebrado em: 22/05/2018
 Valor do contrato: R\$ 881.442,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 65500000
 Cidade: Chapadinha UF: MA
 Data de início: 25/05/2018 Conclusão efetiva: 22/05/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1330.14 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ COM ESPESSURA DE 6,0 CM, UMA ÁREA DE 22.183,42 M2 DE EXTENSÃO, COM 1.330,14 M3 DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIROS: CENTRO, FONTE DO MATO E ALDEIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA. CONTRATO N 107/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 844764/2021
14/04/2021, 09:31
07CAb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 07CAB


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Prefeitura Municipal de Chapadina-MA
 CNPJ CNPJ 0 117.709/0001-58
 End: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadina - MA
 Cep: 65 500-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA, CONFORME CONTRATO - Nº 107/2018.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº **MA20180179319**

Período Obra/Serviço: Início **25/05/2018**. Previsão de Término **22/05/2019**.

DADOS CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001.58

END: Av. Pres. Vargas, S/N- Centro, Chapadina - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM (100%), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001.58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: **1104806916MA** CREA/MA. Período De Participação na Obra: 22/05/2018 a 22/05/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviço de Engenharia de Execução para Pavimentação Asfáltica AAUQ com espessura de 6,0 cm, uma área de 22.183,42 m2 de extensão, com 1.330,14 m3 de massa asfáltica, nos bairros: Centro, Fonte do Mato e Aldela, na Sede do Município de Chapadina- MA. Contrato n 107/2018, conforme projetos e planilhas orçamentária.

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadina MA.

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 844764/2021, em 14/04/2021 emitida



Certidão nº 844764/2021

20/04/2021, 11:36

Chave de Impressão: 07CAb

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844764/2021, em 14/04/2021 em



Certidão nº 844764/2021
20/04/2021, 11:36
Chave de Impressão: 07CAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNIT R\$		PREÇO TOTALS/ BDI R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	259,53	327,24	-
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM						676.387,48
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	22.183,42	1,34	1,70	29.823,75
2.2	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EXISTENTE	SINAPI	M3	665,07	477,41	601,96	317.509,98
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI	M3	665,07	477,41	601,96	317.509,98
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	TXKM	21.448,31	0,54	0,68	11.543,77
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						22.670,73
3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	SICRO 02	M²	21,78	291,20	367,18	6.342,39
3.2	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.	SICRO 02	UND	18,00	158,20	199,48	2.847,65
3.3	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92	SICRO 02	M²	568,46	22,39	28,23	12.726,03
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UND	33,00	22,87	28,83	754,66
Valor Orçamento (A):							R\$ 699.058,21
Valor BDI (B):							R\$ 182.384,29
Valor Total (A + B):							R\$ 881.442,50

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE OITOCENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CHAPADINA-MA, 18 DE MARÇO DE 2021.

Wanderlene Silva do Nascimento

Wanderlene Silva do Nascimento

Sec. Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Eng. Civil Edvaldo Paz Nunes

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
engenheiro Civil

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadina MA.

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


850106/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

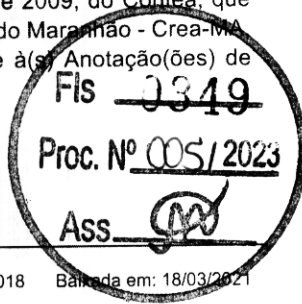

Número da ART: **MA20180205653** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/09/2018** Bateria em: **18/03/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **111/2016** Celebrado em: **14/06/2016**
Valor do contrato: **R\$ 1.957.917,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SETOR URBANO DE CHAPADINHA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SETOR URBANO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Data de início: **05/06/2017** Conclusão efetiva: **17/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2672.75 metro cúbico;**

Observações
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS: CAMPO VELHO, MULTIRÃO E CORRENTE, TOTALIZANDO 2.672,75 M³ DE MASSA ASFÁLTICA (AAUQ) NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 850106/2021
19/07/2021, 12:11
2Bc68

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Bc68





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 000110313774350870100

Proc. Nº 005/2023

ASS. *[Signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

EDVALDO PAZ NUNES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103137743
Registro: 1103137743MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.310

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Nº:

Complemento:
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO
UF: MA

CEP: 65500000

País: Brasil
Telefone: 991446598

Email:

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.500,00
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados da Obra/Serviço

BAIRRO MUTIRAO, CAMPO VELHO E CORRENTE

Nº:

Complemento:
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: ZONA URBANA
UF: MA

CEP: 65500000

Data de Início: 20/05/2016

Previsão de término: 20/09/2016

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	2.672,75	nd
59 - FISCALIZACAO > #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL	914,00	nd
59 - FISCALIZACAO > #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL	91,00	nd

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM SINALIZACAO NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA
BAIRROS: MUTIRAO, CAMPO VELHO E CORRENTE. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 2.672,75M3

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

[Signature]
EDVALDO PAZ NUNES
CREA-MA Nº 1103137743-04
Engenheiro Civil

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37 Registrada em: 20/05/2016 Valor pago: R\$ 74,37 Nosso Número: 8200995344

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZW339
Impressão em: 09/07/2021 às 07:34:42 por: ip: 45.165.16.172

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel (98) 2106-8300 Fax (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850106/2021, emitida em 19/07/2021

Certidão nº 850106/2021
20/07/2021, 10:29


Chave de Impressão: 2Bc68

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 1 folhas





Prefeitura Municipal de Chapadinda-MA
CNPJ: CNPJ: 0.117.709/0001-58
End. Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadinda - MA
Cep: 65.500-000.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINDA - MA, CONFORME CONTRATO - Nº 111/2016.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº • MA20180205653

Período Obra/Serviço: Início 05/06/2017 Previsão de Término 17/06/2019.

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA CNPJ: Nº 06.117.709/0001.58

END: Av. Pres. Vargas, S/N- Centro, Chapadinda - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM (100%), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA

CNPJ: 06.117.709/0001.58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME
CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviço de engenharia para execução de recapeamento asfáltico de vias urbanas nos Bairros: Campo Velho, Mutirão e Corrente, totalizando 2.672,75 m³ de massa asfáltica (AAUQ), na Sede do Município de Chapadinda- MA. Conforme projetos e planilhas orçamentária.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 850106/2021, em 19/07/2021 emitida



Certidão nº 850106/2021
20/07/2021, 10:29
Chave de Impressão: 2Bc68

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 2 folhas

1
Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadinda MA.

[Handwritten signatures and initials]





Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA
 CNPJ CNPJ 0 117 7000001-58
 End. Rua Presidente Vargas, 8/N, Centro Chapadinha - MA
 Cep: 65.500-000

Fis 0352
 Proc. Nº 005/2023
 Ass. *[Assinatura]*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL S/ BDI R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-			
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM						
2.1	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA (EXEC. + FORNEC. DE MAT.+ TRANSPORTE) - 1ª DEMÃO - CM-73	SINAPI	M2	22.272,92			
2.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	44.545,83			
2.3	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE E=3CM	SINAPI	M3	1.336,37			
2.4	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM	SINAPI	M3	1.336,37			
2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	TXXM	93.474,13			
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA -	SICRO	M2	43,56			
3.2	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN. -	SICRO	UND	36,00			
3.3	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRIL. E=0,6MM-NBR 11862/92	SICRO	M2	815,00			
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UND	30,00			
					Valor Orçamento (A) - R\$		
					Valor BDI (B) - R\$		
					Valor Total (A + B) - R\$		

Eng. Nick Macklewe de Santana Mendes - CHAPADINHA-MA, 18 DE MARÇO DE 2021

[Assinatura]
 Nick Macklewe de Santana Mendes / Sec. Municipal de Obras
 CREA 110.313.774-2
[Assinatura]
 Edvaldo Paz Nunes / Eng. Civil
 CREA 110.313.774-2

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.708/0001-58 - Chapadinha MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 850106/2021, em 19/07/2021 emitida em



Certidão nº 850106/2021
 20/07/2021, 10:29
 Chave de Impressão: 2Bc68

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


799524/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

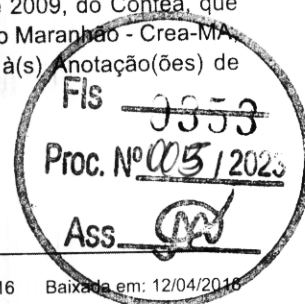

Número da ART: **00011048069165057010** Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO ME**

Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 11/07/2016 Baixada em: 12/04/2016

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N. 310
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº:

CEP: 65500000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 520.038,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEDE DO MUNICIPIO
Complemento:

Bairro: ZONA URBANA
UF: MA

Nº:
CEP: 65500000

Data de início: 01/07/2016 Conclusão efetiva: 01/07/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 771 M3;**

Observações

SERVICO DE ENGENHARIA DE EXECUCAO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA AAUQ COM ESPESSURA DE 3,0 CM, UMA AREA DE 25.700 M2 DE EXTENSAO COM 771 M3 DE MASSA ASFALTICA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA- MA. CONTRATO N 129/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799524/2018
18/05/2018, 13:23
4CyZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4CyZZ





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fls 0354
Proc. Nº 005/2023
Ass. [Signature]

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Contratada **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA – ME**, inscrita no CNPJ nº 07.737.378/0001-11, com sede Rodovia BR 316, Lote PV Barroca Funda s/n, Bairro Boa Esperança, CEP 65.636-849 em Timon - MA, que tem como responsável técnico o **Engenheiro Civil DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** de CREA nº 8017/DMA, RNP:110480691-6, executou serviço de pavimentação asfáltica no município de Chapadinhá - MA., conforme Contrato Nº N 129/2016 e registrada na ART nº 00011048069165057010, em 01 de julho de 2016.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviço de Engenharia de execução para pavimentação asfáltica AAUQ com espessura de 3,0 cm, com uma área de 25.700,00 m² de extensão, com 771 m³ de massa asfáltica conforme ART 00011048069165057010. Entre período de 01.07.16 à 01.07.17.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Chapadinhá CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58.

No qual extraímos os seguintes quantitativos como referência:

Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	M ²	127,17
Pintura de ligação com emulsão RR-2C	M ²	25.700,00
Areia Asfalto a Quente (AAUQ) com CAP 50/70, Includo usinagem e aplicação, exclusive transporte e=0,03 m	M ³	771,00
Transporte de AAUQ DMT = 15 km	T.km	23.079,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 799524/2018, em 18/05/2018 emitida



[Signature]
CHAPADINHÁ-MA, 01 DE JULHO DE 2017.

Edvaldo Pinheiro Nunes
CREANAC: 110.313.714-3
Engenheiro Civil

2º OFÍCIO



1

Certidão nº 799524/2018
30/04/2021, 16:24

Chave de impressão: 4CyZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2018 e contém 1 folhas

Scanned by CamScanner



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303127757	
NIRE 21201337158 CNPJ 07.737.378/0001-11		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rodovia BR-316, Nº SN, LOTE PV BARROCA FUNDA, BOA ESPERANCA - Timon/MA - CEP 65636-849			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201337158	30/01/2023	TRANSFORMAÇÃO
002	21201337158	30/01/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210177217	09/03/2021	BALANÇO
002	20200041860	20/01/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190399392	07/06/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190399392	07/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20190764449	07/06/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20190059389	12/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190067322	12/02/2019	BALANÇO
002	20180251430	08/03/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20180059491	07/02/2018	BALANÇO
002	20170293564	15/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20170223183	17/01/2017	BALANÇO
223	20160270235	03/03/2016	BALANÇO
002	20151172765	03/08/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150294760	20/04/2015	BALANÇO
223	20130232394	26/03/2013	BALANÇO
002	20120498758	02/08/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110238150	12/04/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100595855	28/09/2010	BALANÇO
002	20090569946	16/10/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20050381164	22/11/2005	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101447920	22/11/2005	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/12/2023, às 11:06:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHECGGGJ.



MAC2303127757

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA			Protocolo: MAC2303127697			
NIRE : 21201337158 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 21201337158	CNPJ 07.737.378/0001-11	Data de Ato Constitutivo 22/11/2005	Início de Atividade 17/11/2005			
Endereço Completo Rodovia BR-316, N° SN, LOTE PV BARROCA FUNDA, BOA ESPERANCA - Timon/MA - CEP 65636-849						
Objeto Social CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ADMINISTRACAO DE OBRAS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUSIVE O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE TERRAPLENAGEM) OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(CAMINHOS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(FABRICACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE SUBSTANCIAS VEGETAIS, NATURAIS OU SINTETICAS, AGLOMERADOS COM ASFALTO OU BETUMES. FABRICACAO DE ARTIGOS DE ASFALTO, DE BREU E DE MATERIAIS SIMILARES. ASFALTO FABRICACAO DE CBUQ E MASSA ASFALTICA, ASFALTO FABRICACAO DE TSD E TSE) COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUBOS E CANOS DE AGUA, ASFALTO, MASSA ASFALTICA E PRODUTOS SIMILARES UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS) COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
Capital Social R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)						
Dados do Sócio		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO		497.801.583-91	R\$ 5.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato			
Nome ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO		497.801.583-91	Indeterminado			
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos		Situação ATIVA	
Data 30/01/2023		21201337158	002 / 046 - TRANSFORMACAO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/12/2023, às 11:05:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QJZ3A9JA.



MAC2303127697

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304593120 em 05/04/2023, protocolo 230447767. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Número de Registro:	21201337158
GNPJ:	07737378000111
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE	PI06913
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:39 SOB Nº 20230447767.
PROTOCOLO: 230447767 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304593120. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Página 1 de 23

Página: 1

Fis 0358

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

Diário nº 4

Termo de abertura

Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito, no período de 01/01/2022 à 31/12/2022:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976

Data de registro: 22/11/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Timon / MA, 01 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista


CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91




CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/01/2022

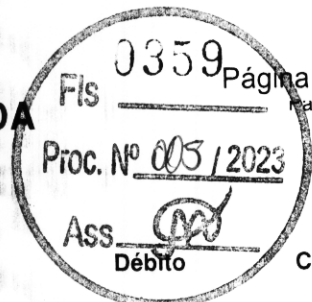Página 2 de 23
Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/01/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	19.623,00	19.623,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.536,30	1.536,30
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	3.924,60	3.924,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.452,85	1.452,85
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.387,40	2.387,40
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/01/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	18.135,32	18.135,32
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	48,62	48,62
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.452,85	1.452,85
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	5.594,22	5.594,22
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.387,40	2.387,40
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
06/01/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	390.232,86	390.232,86
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	390.232,86	390.232,86
10/01/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	123.987,69	123.987,69
30/01/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	43.500,00	43.500,00
			Total mês : 01/2022	1.007.919,97	1.007.919,97

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO


Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158
I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/02/2022 a 28/02/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Debito	Crédito
03/02/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	19.623,00	19.623,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.277,43	1.277,43
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	3.924,60	3.924,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.282,16	1.282,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.649,84	2.649,84
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1384	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
04/02/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	782.018,45	782.018,45
05/02/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	18.396,84	18.396,84
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.282,16	1.282,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	5.335,35	5.335,35
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.649,84	2.649,84
02.1.5.01.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/02/2022					
03.1.2.01.010	2322	Provisão de imposto	1662	66.339,59	66.339,59
15/02/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	314.200,00	314.200,00
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	115.000,00	115.000,00
20/02/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	45.500,00	45.500,00
22/02/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	115.200,00	115.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	84.500,00	84.500,00
24/02/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	861.137,99	861.137,99
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	16.431,56	16.431,56
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.626.724,88	1.626.724,88
25/02/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	21.100,00	21.100,00
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.100,00	22.100,00
04.2.1.03.037	3097	Pagamento de despesas	78	210.481,20	210.481,20
28/02/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	49.100,00	49.100,00

Total mês : 02/2022 4.389.730,16 4.389.730,16

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CPF: 398.204.243-72
CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Fis 0361 Página 4 de 23

pagina: 4

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/03/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	22.120,41	22.120,41
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.965,20	1.965,20
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.424,08	4.424,08
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.840,10	1.840,10
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.597,48	1.597,48
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	450,00	450,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/03/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	20.206,48	20.206,48
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.840,10	1.840,10
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	6.522,60	6.522,60
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.597,48	1.597,48
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	450,00	450,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/03/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	197.178,78	197.178,78
15/03/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	54.100,00	54.100,00
20/03/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	11.523,10	11.523,10
22/03/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	101.000,00	101.000,00
25/03/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.000,00	22.000,00
30/03/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	36.400,00	36.400,00
			Total mês : 03/2022	487.691,08	487.691,08

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/04/2022 a 30/04/2022

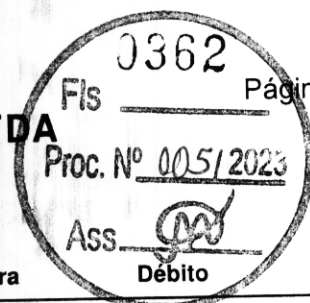Página 5 de 23
Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/04/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.520,15	23.520,15
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.120,52	2.120,52
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.704,03	4.704,03
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.030,20	2.030,20
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.736,90	1.736,90
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	425,00	425,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/04/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.450,90	21.450,90
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.030,20	2.030,20
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	6.957,87	6.957,87
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.736,90	1.736,90
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	425,00	425,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
15/04/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	14.200,00	14.200,00
20/04/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	45.200,00	45.200,00
22/04/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	66.000,00	66.000,00
25/04/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.100,00	22.100,00
30/04/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	36.500,00	36.500,00
Total mês : 04/2022				253.612,94	253.612,94

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Fls

0363

Página 6 de 23

Proc. Nº 005 / 2023

Ass.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/05/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.520,15	23.520,15
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.212,19	2.212,19
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.704,03	4.704,03
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.190,50	2.190,50
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.842,39	1.842,39
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/05/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.359,23	21.359,23
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.190,50	2.190,50
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.049,54	7.049,54
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.842,39	1.842,39
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
15/05/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	65.840,00	65.840,00
19/05/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	452.463,64	452.463,64
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	4.570,34	4.570,34
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	447.893,30	447.893,30
20/05/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de parcela do simples nacional	78	31.200,00	31.200,00
22/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	96.500,00	96.500,00
25/05/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.300,00	22.300,00
04.2.1.03.037	3097	Pagamento de despesas	78	113.115,91	113.115,91
30/05/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	32.200,00	32.200,00
Total mês : 05/2022				1.336.469,38	1.336.469,38

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/06/2022 a 30/06/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/06/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.520,15	23.520,15
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.285,84	2.285,84
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.704,03	4.704,03
04.2.1.02.004	3042	Provisão de FGTS	1392	2.210,30	2.210,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.620,01	1.620,01
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/06/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.285,58	21.285,58
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.210,30	2.210,30
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.123,19	7.123,19
02.1.5.01.004	1768	Pagamento de energia	78	1.620,01	1.620,01
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.01.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
09/06/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	1.290.236,97	1.290.236,97
10/06/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	54.295,64	54.295,64
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	13.032,70	13.032,70
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.277.204,27	1.277.204,27
15/06/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	476.523,31	476.523,31
22/06/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	1.186.200,00	1.186.200,00
25/06/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.600,00	22.600,00
04.2.1.03.037	3097	Pagamento de despesas	78	52.559,41	52.559,41
30/06/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	52.300,00	52.300,00
Total mês : 06/2022				4.495.006,98	4.495.006,98

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CPF: 398.204.243-72
CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Fis 0365

Página 8 de 23
Página: 0

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/07/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	25.120,52	25.120,52
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.410,30	2.410,30
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	5.024,10	5.024,10
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.395,20	2.395,20
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.367,90	1.367,90
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.03.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/07/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	22.761,49	22.761,49
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.395,20	2.395,20
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.567,72	7.567,72
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.367,90	1.367,90
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/07/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	154.828,44	154.828,44
15/07/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	261.847,03	261.847,03
20/07/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	124.152,31	124.152,31
22/07/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/07/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.300,00	16.300,00
30/07/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	55.000,00	55.000,00
			Total mês : 07/2022	696.013,38	696.013,38

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA Fis

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/08/2022 a 31/08/2022

0366 Pagina 9 de 23
Pagina: 9

Proc. Nº 005 / 2023

ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Debitos	Crédito
03/08/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.410,50	23.410,50
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.219,15	2.219,15
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.682,10	4.682,10
04.2.1.01.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.140,30	2.140,30
04.2.1.02.004	3123	Provisão de energia	1768	1.442,22	1.442,22
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/08/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.242,62	21.242,62
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.140,30	2.140,30
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.034,57	7.034,57
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.442,22	1.442,22
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
15/08/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	21.620,00	21.620,00
20/08/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	53.642,31	53.642,31
22/08/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	84.695,35	84.695,35
25/08/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.100,00	23.100,00
30/08/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	36.850,00	36.850,00
			Total mês : 08/2022	289.136,91	289.136,91

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/09/2022 a 30/09/2022

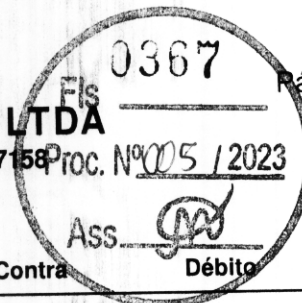

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/09/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.684,20	23.684,20
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.241,85	2.241,85
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.736,84	4.736,84
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.060,30	2.060,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.787,41	1.787,41
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/09/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.493,62	21.493,62
02.1.3.01.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.060,30	2.060,30
02.1.3.01.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.112,01	7.112,01
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.787,41	1.787,41
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
03/09/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	569.065,72	569.065,72
15/09/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	168.542,00	168.542,00
22/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedoras	78	84.600,00	84.600,00
25/09/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.200,00	23.200,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	5.690,66	5.690,66
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	563.375,06	563.375,06
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	42.266,43	42.266,43
30/09/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	74.100,00	74.100,00
Total mês : 09/2022				1.601.279,08	1.601.279,08

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/10/2022 a 31/10/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/10/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	29.541,30	29.541,30
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.781,55	2.781,55
04.2.1.01.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	5.908,26	5.908,26
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.595,24	2.595,24
04.2.1.01.004	3123	Provisão de energia	1768	1.579,85	1.579,85
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/10/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	26.811,02	26.811,02
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.595,24	2.595,24
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	8.823,13	8.823,13
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.579,85	1.579,85
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/10/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	68.287,89	68.287,89
15/10/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	141.200,00	141.200,00
19/10/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	302.304,20	302.304,20
20/10/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	84.652,65	84.652,65
22/10/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	59.630,00	59.630,00
25/10/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.600,00	23.600,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	3.023,04	3.023,04
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	299.281,16	299.281,16
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	75.576,05	75.576,05
30/10/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	48.200,00	48.200,00
Total mês : 10/2022				1.191.445,70	1.191.445,70

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Fls 0369 Página 12 de 23

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/11/2022					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 1ª parcela do 13º salário	1317	14.741,26	14.741,26
03/11/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	28.741,60	28.741,60
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.745,20	2.745,20
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	5.748,32	5.748,32
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.641,30	2.641,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.818,76	1.818,76
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/11/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	26.047,67	26.047,67
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.641,30	2.641,30
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	8.626,84	8.626,84
02.1.5.01.004	1768	Pagamento de energia	78	1.818,76	1.818,76
2.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/11/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	36.276,51	36.276,51
15/11/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	54.850,00	54.850,00
20/11/2022					
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário	78	14.741,26	14.741,26
22/11/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	96.500,00	96.500,00
25/11/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.900,00	23.900,00
30/11/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	96.300,00	96.300,00
Total mês : 11/2022				421.614,05	421.614,05

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA


CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Fls 0370 Página 13 de 23
 Proc. Nº 005/2023
 Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/12/2022					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 2ª parcela do 13º salário	1317	14.741,26	14.741,26
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	78	12.022,74	12.022,74
02.1.3.01.004	1317	Provisão do INSS s/13º salário	1430	2.718,52	2.718,52
04.2.1.01.001	3034	Provisão de INSS s/13º patronal	1430	5.896,50	5.896,50
02.1.3.04.007	1430	Pagamento de INSS s/13º salário	51	8.615,02	8.615,02
03/12/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	31.410,52	31.410,52
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	3.065,29	3.065,29
04.2.1.01.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	6.282,10	6.282,10
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	3.140,10	3.140,10
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.808,59	1.808,59
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	520,00	520,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/12/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	28.396,50	28.396,50
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	3.140,10	3.140,10
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	9.480,71	9.480,71
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.808,59	1.808,59
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	520,00	520,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
22/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	65.100,00	65.100,00
25/12/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	24.550,00	24.550,00
30/12/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	41.200,00	41.200,00
31/12/2022					
02.4.4.04.004	3922	Distribuição de Lucros Total ao longo do ano	78	545.150,41	545.150,41
02.4.4.04.004	3922	Encerramento do Exercício			545.150,41
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		4.647.459,83	
03.1.2.02.010	2322	Encerramento do Exercício			701.194,54
03.1.2.02.007	2305	Encerramento do Exercício			42.748,30
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício			293.835,50
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício			64.663,59
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício			25.978,55
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício			21.638,75
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício			5.895,00
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício			14.544,00
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício			601.650,00
04.1.3.01.002	2819	Encerramento do Exercício			1.687.922,34
04.2.1.03.037	3097	Encerramento do Exercício			452.478,68
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício			29.482,52
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício			3.903.516,99
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício		3.743.239,34	
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício	2038	160.277,65	160.277,65
01.1.1.01.001	51	Encerramento do Exercício ajuste	3097	83.040,64	83.040,64
01.1.1.01.001	51	Encerramento do Exercício ajuste	78	7.420,00	7.420,00
Total mês : 12/2022				9.453.479,68	9.453.479,68



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158


I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta

Código Histórico

Contra



RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls

0372

Página 15 de 23

Proc. Nº 005/2023

Ass.

2022

Código	Classificação	Nome	
19	01	ATIVO	4.232.426,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.380.476,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.662.727,49
43	01.1.1.01	CAIXA	4.768,75
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.768,75
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.657.958,74
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	2.657.958,74
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	717.749,37
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	717.749,37
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	717.749,37
795	01.3	ATIVO PERMANENTE	851.950,06
817	01.3.2	IMOBILIZADO	851.950,06
825	01.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.509.000,00
833	01.3.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	520.000,00
876	01.3.2.01.005	Veículos	989.000,00
957	01.3.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(657.049,94)
965	01.3.2.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(209.666,65)
1007	01.3.2.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(447.383,29)
163	02	PASSIVO	4.232.426,92
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.065,90
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	832.989,05
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	832.989,05
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	832.989,05
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.371,68
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	313.371,68
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	313.371,68
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127,24
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127,24
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	(1.225,18)
1430	02.1.3.04.007	INSS 13ª a Pagar	1.352,42
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	466.577,93
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	305.324,17
1662	02.1.4.03.009	Imposto a Pagar	305.324,17
1655	02.1.4.04	Parcelamento de impostos	161.253,76
1661	02.1.4.04.001	Simplex Nacional a recolher - Parcelamento	161.253,76
1775	02.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	554.418,90
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.418,90
1814	02.2.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	554.418,90
1815	02.2.1.02.001	Simplex Nacional a recolher - Parcelamento	554.418,90
1902	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.064.942,12
1910	02.4.1	CAPITAL	1.500.000,00
1929	02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
1937	02.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.500.000,00
2011	02.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.942,12
2020	02.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.942,12
2038	02.4.4.03.001	Lucros Acumulados	564.942,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.232.426,92 (Quatro Milhões Duzentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página 16 de 23

Página: 10

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

Código	Classificação	Nome	2022
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.647.459,83
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.647.459,83
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.647.459,83
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	4.647.459,83
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(743.942,84)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(743.942,84)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(42.748,30)
257	03.2.2.010	Impostos s/ vendas e serviços	(701.194,54)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	3.903.516,99
701	06	CUSTOS	1.729.442,66
711	06.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS/CONSUMIDAS	1.729.442,66
712	06.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.729.442,66
714	06.3.01.001	Custo das mercadorias utilizadas na prestação de serviço	1.729.442,66
1783	07	RESULTADO BRUTO	2.174.074,33
80	08	DESPESAS	1.468.646,27
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.468.646,27
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	337.862,02
884	08.1.01.001	Salários	293.835,50
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00
922	08.1.01.005	13.Salário	29.482,52
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	90.642,14
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	64.663,59
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	25.978,55
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	1.040.142,11
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	5.895,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	21.638,75
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	601.650,00
1034	08.1.03.036	Despesas Operacionais Diversas	410.958,36
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	705.428,06
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	705.428,06
388	15	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO	545.150,41
396	15.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	545.150,41
418	15.01.002	Lucros Distribuídos	545.150,41
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.277,65
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.277,65
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	160.277,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados.

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA


CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2022 a 31/12/2022

Página 17 de 23

Página: 17

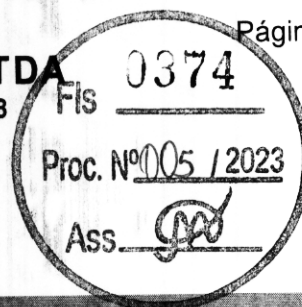

2022

Nome**FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado Líquido do Exercício	705.428,06
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	0,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(362.003,01)
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	305.324,17
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	648.749,22

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	545.150,41
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	266.850,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(812.000,41)

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades (163.251,19)

Disponibilidades no Início do Período 2.785.070,95

Disponibilidades no Final do Período 2.662.727,49

Variação das Disponibilidades (122.343,46)

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2022 a 31/12/2022

Fis 0375

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

Nome

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO

2022

1.904.664,47

SALDO NO FINAL DO PERÍODO

2.064.942,12

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Índices de liquidez de 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls 0376

Página 19 de 23

Página: 19

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

2022

Código	Classificação	Nome	
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.380.476,86
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.167.484,80
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,56
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	3.380.476,86
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.065,90
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	2,10
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.380.476,86
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.065,90
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	2,10
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
230	04.1	DISPONÍVEL	2.662.727,49
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.065,90
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,65
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	3.380.476,86
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.065,90
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.767.410,96
310	06	SOLVÊNCIA GERAL (SG)	1.767.410,96
315	06.01	ATIVO TOTAL	4.232.426,92
320	06.02	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.167.484,80
325	06.03	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)	1,95

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA


CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

Empresa: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ: 07.737.378/0001-11

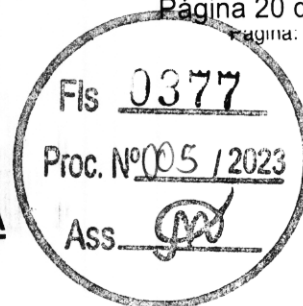

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA é uma sociedade unipessoal LTDA, com sede e foro na cidade de Timon- MA, tendo como objeto social a execução de obras de construção civil diversas, como construções de edifícios, pavimentação asfáltica, obras de terraplenagem, dentre outras.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e fornecedores, no valor de R\$1.613.065,90, junto às instituições financeiras nacionais.

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

6) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

7) ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Índices de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das demonstrações contábeis / financeiras das empresas - especialmente da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


TIMON, MA - 31/12/2022

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022



ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

RG:

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CRC: 06913

CPF: 398.204.243-72

RG: 930911

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Página 22 de 23
Página: 22



Diário nº 4

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22, e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito no período de 01/01/2022 à 31/12/2022:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUND

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976

Data de registro: 22/11/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Timon / MA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista


CPF: 398.204.243-72


CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91





ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:39 SOB Nº 20230447767.
PROTOCOLO: 230447767 DE 03/04/2023. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304593120 em 05/04/2023, protocolo 230447767. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Número de Registro:	21201337158
CNPJ:	07737378000111
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE	PI06913
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	

JUCEMA


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2023 10:39 SOB Nº 20230447767.
PROTOCOLO: 230447767 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304593120. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Página 1 de 23

Página: 1



Diário nº 4

Termo de abertura

Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito, no período de 01/01/2022 à 31/12/2022:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976

Data de registro: 22/11/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Timon / MA, 01 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

[Signature]

[Signature]

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Fis 0383

Página 2 de 23

Página: 2

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/01/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	19.623,00	19.623,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.536,30	1.536,30
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	3.924,60	3.924,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.452,85	1.452,85
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.387,40	2.387,40
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/01/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	18.135,32	18.135,32
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	48,62	48,62
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.452,85	1.452,85
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	5.594,22	5.594,22
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.387,40	2.387,40
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
07/01/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	390.232,86	390.232,86
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	390.232,86	390.232,86
10/01/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	123.987,69	123.987,69
30/01/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	43.500,00	43.500,00
			Total mês : 01/2022	1.007.919,97	1.007.919,97

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/02/2022 a 28/02/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/02/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	19.623,00	19.623,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.277,43	1.277,43
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	3.924,60	3.924,60
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.282,16	1.282,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.649,84	2.649,84
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
04/02/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	782.018,45	782.018,45
05/02/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	18.396,84	18.396,84
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.282,16	1.282,16
02.1.3.01.001	1384	Pagamento de INSS	51	5.335,35	5.335,35
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.649,84	2.649,84
02.1.5.01.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/02/2022					
03.1.2.01.010	2322	Provisão de imposto	1662	66.339,59	66.339,59
15/02/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	314.200,00	314.200,00
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	115.000,00	115.000,00
20/02/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	45.500,00	45.500,00
22/02/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	115.200,00	115.200,00
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	84.500,00	84.500,00
24/02/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	861.137,99	861.137,99
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	16.431,56	16.431,56
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.626.724,88	1.626.724,88
25/02/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	21.100,00	21.100,00
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.100,00	22.100,00
04.2.1.03.037	3097	Pagamento de despesas	78	210.481,20	210.481,20
28/02/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	49.100,00	49.100,00
			Total mês : 02/2022	4.389.730,16	4.389.730,16

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CPF: 398.204.243-72
CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Fis 0385

Página 4 de 23

Proc. Nº 005 / 2023


Página: 4

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/03/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	22.120,41	22.120,41
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.965,20	1.965,20
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.424,08	4.424,08
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.840,10	1.840,10
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.597,48	1.597,48
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	450,00	450,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/03/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	20.206,48	20.206,48
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.840,10	1.840,10
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	6.522,60	6.522,60
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.597,48	1.597,48
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	450,00	450,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/03/2022					
08.1.2.01.010	2322	Provisão de imposto	1662	197.178,78	197.178,78
15/03/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	54.100,00	54.100,00
20/03/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	11.523,10	11.523,10
22/03/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	101.000,00	101.000,00
25/03/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.000,00	22.000,00
30/03/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	36.400,00	36.400,00
Total mês : 03/2022				487.691,08	487.691,08

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CPF: 398.204.243-72
CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91




CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/04/2022 a 30/04/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/04/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.520,15	23.520,15
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.120,52	2.120,52
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.704,03	4.704,03
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.030,20	2.030,20
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.736,90	1.736,90
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	425,00	425,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/04/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.450,90	21.450,90
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.030,20	2.030,20
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	6.957,87	6.957,87
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.736,90	1.736,90
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	425,00	425,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
5/04/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	14.200,00	14.200,00
20/04/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	45.200,00	45.200,00
22/04/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	66.000,00	66.000,00
25/04/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.100,00	22.100,00
30/04/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	36.500,00	36.500,00
Total mês : 04/2022				253.612,94	253.612,94

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/05/2022 a 31/05/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/05/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.520,15	23.520,15
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.212,19	2.212,19
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.704,03	4.704,03
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.190,50	2.190,50
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.842,39	1.842,39
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/05/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.359,23	21.359,23
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.190,50	2.190,50
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.049,54	7.049,54
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.842,39	1.842,39
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
5/05/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	65.840,00	65.840,00
19/05/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	452.463,64	452.463,64
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	4.570,34	4.570,34
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	447.893,30	447.893,30
20/05/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de parcela do simples nacional	78	31.200,00	31.200,00
22/05/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	96.500,00	96.500,00
25/05/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.300,00	22.300,00
04.2.1.03.037	3097	Pagamento de despesas	78	113.115,91	113.115,91
30/05/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	32.200,00	32.200,00
Total mês : 05/2022				1.336.469,38	1.336.469,38

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/06/2022 a 30/06/2022

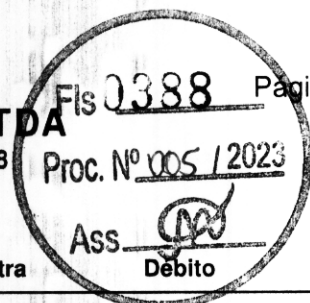

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/06/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.520,15	23.520,15
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.285,84	2.285,84
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.704,03	4.704,03
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.210,30	2.210,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.620,01	1.620,01
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/06/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.285,58	21.285,58
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.210,30	2.210,30
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.123,19	7.123,19
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.620,01	1.620,01
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
09/06/2022					
01.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	1.290.236,97	1.290.236,97
10/06/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	54.295,64	54.295,64
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	13.032,70	13.032,70
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.277.204,27	1.277.204,27
15/06/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	476.523,31	476.523,31
22/06/2022					
02.1.1.03.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	1.186.200,00	1.186.200,00
25/06/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	22.600,00	22.600,00
04.2.1.03.037	3097	Pagamento de despesas	78	52.559,41	52.559,41
30/06/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	52.300,00	52.300,00
Total mês : 06/2022				4.495.006,98	4.495.006,98

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91


CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11

NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/07/2022 a 31/07/2022

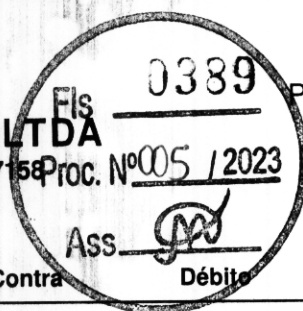

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/07/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	25.120,52	25.120,52
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.410,30	2.410,30
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	5.024,10	5.024,10
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.395,20	2.395,20
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.367,90	1.367,90
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.03.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/07/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	22.761,49	22.761,49
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.395,20	2.395,20
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.567,72	7.567,72
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.367,90	1.367,90
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/07/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	154.828,44	154.828,44
15/07/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	261.847,03	261.847,03
20/07/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	124.152,31	124.152,31
22/07/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/07/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.300,00	16.300,00
30/07/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	55.000,00	55.000,00
Total mês : 07/2022				696.013,38	696.013,38

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador


CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/08/2022 a 31/08/2022

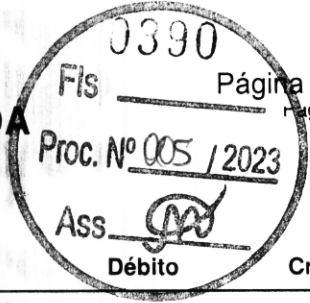

Página 9 de 23

Página: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/08/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.410,50	23.410,50
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.219,15	2.219,15
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.682,10	4.682,10
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.140,30	2.140,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.442,22	1.442,22
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/08/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.242,62	21.242,62
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.140,30	2.140,30
02.1.3.01.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.034,57	7.034,57
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.442,22	1.442,22
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
15/08/2022					
02.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	21.620,00	21.620,00
20/08/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	53.642,31	53.642,31
22/08/2022					
02.1.1.01.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	84.695,35	84.695,35
25/08/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.100,00	23.100,00
30/08/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	36.850,00	36.850,00
Total mês : 08/2022				289.136,91	289.136,91

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Fis 0391 Página 10 de 23

pagina: 10

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/09/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	23.684,20	23.684,20
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.241,85	2.241,85
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	4.736,84	4.736,84
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.060,30	2.060,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.787,41	1.787,41
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/09/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	21.493,62	21.493,62
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.060,30	2.060,30
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	7.112,01	7.112,01
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.787,41	1.787,41
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
13/09/2022					
02.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	569.065,72	569.065,72
15/09/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	168.542,00	168.542,00
22/09/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	84.600,00	84.600,00
25/09/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.200,00	23.200,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	5.690,66	5.690,66
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	563.375,06	563.375,06
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	42.266,43	42.266,43
30/09/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	74.100,00	74.100,00
Total mês : 09/2022				1.601.279,08	1.601.279,08

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11

NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Fis 0392 Pagina 11 de 23

pagina: 11

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/10/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	29.541,30	29.541,30
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.781,55	2.781,55
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	5.908,26	5.908,26
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.595,24	2.595,24
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.579,85	1.579,85
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/10/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	26.811,02	26.811,02
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.595,24	2.595,24
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	8.823,13	8.823,13
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.579,85	1.579,85
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/10/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	68.287,89	68.287,89
15/10/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	141.200,00	141.200,00
19/10/2022					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	302.304,20	302.304,20
20/10/2022					
02.1.4.03.009	1662	Pagamento de imposto	78	84.652,65	84.652,65
22/10/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	59.630,00	59.630,00
25/10/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.600,00	23.600,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	3.023,04	3.023,04
01.1.1.01.001	78	Serviços Prestados	159	299.281,16	299.281,16
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	75.576,05	75.576,05
30/10/2022					
04.2.1.01.010	3182	Pgto Combustíveis	78	48.200,00	48.200,00
Total mês : 10/2022				1.191.445,70	1.191.445,70

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201331588

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Fls 0393

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

Página 12 de 23

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/11/2022					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 1ª parcela do 13º salário	1317	14.741,26	14.741,26
03/11/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	28.741,60	28.741,60
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	2.745,20	2.745,20
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	5.748,32	5.748,32
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	2.641,30	2.641,30
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.818,76	1.818,76
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/11/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	26.047,67	26.047,67
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	2.641,30	2.641,30
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	8.626,84	8.626,84
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.818,76	1.818,76
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
10/11/2022					
03.1.2.02.010	2322	Provisão de imposto	1662	36.276,51	36.276,51
15/11/2022					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	54.850,00	54.850,00
20/11/2022					
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário	78	14.741,26	14.741,26
22/11/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	96.500,00	96.500,00
25/11/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	23.900,00	23.900,00
30/11/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	96.300,00	96.300,00
Total mês : 11/2022				421.614,05	421.614,05

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 Contabilista
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 06913


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583/91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2022 a 31/12/2022



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/12/2022					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 2ª parcela do 13º salário	1317	14.741,26	14.741,26
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	78	12.022,74	12.022,74
02.1.3.01.004	1317	Provisão do INSS s/13º salário	1430	2.718,52	2.718,52
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS s/13º patronal	1430	5.896,50	5.896,50
02.1.3.04.007	1430	Pagamento de INSS s/13º salário	51	8.615,02	8.615,02
03/12/2022					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	31.410,52	31.410,52
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	3.065,29	3.065,29
04.2.1.02.001	3034	Provisão de INSS patronal	1384	6.282,10	6.282,10
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	3.140,10	3.140,10
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.808,59	1.808,59
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	520,00	520,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.212,00	1.212,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	133,32	133,32
05/12/2022					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	28.396,50	28.396,50
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.01.003	1392	Pagamento de FGTS	51	3.140,10	3.140,10
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	9.480,71	9.480,71
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.808,59	1.808,59
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	520,00	520,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.078,68	1.078,68
22/12/2022					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	65.100,00	65.100,00
25/12/2022					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	24.550,00	24.550,00
30/12/2022					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	41.200,00	41.200,00
31/12/2022					
02.4.4.04.004	3922	Distribuição de Lucros Total ao longo do ano	78	545.150,41	545.150,41
02.4.4.04.004	3922	Encerramento do Exercício			545.150,41
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		4.647.459,83	
03.1.2.02.010	2322	Encerramento do Exercício			701.194,54
03.1.2.02.007	2305	Encerramento do Exercício			42.748,30
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício			293.835,50
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício			64.663,59
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício			25.978,55
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício			21.638,75
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício			5.895,00
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício			14.544,00
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício			601.650,00
04.1.3.01.002	2819	Encerramento do Exercício			1.687.922,34
04.2.1.03.037	3097	Encerramento do Exercício			452.478,68
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício			29.482,52
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício			3.903.516,99
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício		3.743.239,34	
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício	2038	160.277,65	160.277,65
01.1.1.01.001	51	Encerramento do Exercício ajuste	3097	83.040,64	83.040,64
01.1.1.01.001	51	Encerramento do Exercício ajuste	78	7.420,00	7.420,00
Total mês : 12/2022				9.453.479,68	9.453.479,68

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158


I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta

Código Histórico

Contra



RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

0396

Página 15 de 23

Página: 15

Proc. Nº 005/2023

Ass

2022

Código	Classificação	Nome	
19	01	ATIVO	4.232.426,92
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.380.476,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.662.727,49
43	01.1.1.01	CAIXA	4.768,75
51	01.1.1.01.001	Caixa	4.768,75
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.657.958,74
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	717.749,37
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	717.749,37
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	717.749,37
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	851.950,06
795	01.3	ATIVO PERMANENTE	851.950,06
817	01.3.2	IMOBILIZADO	1.509.000,00
825	01.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	520.000,00
833	01.3.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	989.000,00
876	01.3.2.01.005	Veículos	(657.049,94)
957	01.3.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(209.666,65)
965	01.3.2.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(447.383,29)
1007	01.3.2.05.005	(-) Veículos - Depreciação	
163	02	PASSIVO	4.232.426,92
71	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.065,90
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	832.989,05
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	832.989,05
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	313.371,68
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.371,68
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	313.371,68
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	127,24
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	127,24
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.225,18)
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.352,42
1430	02.1.3.04.007	INSS 13º a Pagar	466.577,93
1485	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.324,17
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	305.324,17
1662	02.1.4.03.009	Imposto a Pagar	161.253,76
1655	02.1.4.04	Parcelamento de impostos	161.253,76
1661	02.1.4.04.001	Simplex Nacional a recolher - Parcelamento	554.418,90
1775	02.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	554.418,90
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.418,90
1814	02.2.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	554.418,90
1815	02.2.1.02.001	Simplex Nacional a recolher - Parcelamento	2.064.942,12
1902	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.500.000,00
1910	02.4.1	CAPITAL	1.500.000,00
1929	02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
1937	02.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	564.942,12
2011	02.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.942,12
2020	02.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.942,12
2038	02.4.4.03.001	Lucros Acumulados	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.232.426,92 (Quatro Milhões Duzentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos).

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

0397 Página 16 de 23

Página: 10

Proc. Nº 005/2023

Ass. 

Código	Classificação	Nome	2022
19	03	RECEITAS	4.647.459,83
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.647.459,83
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.647.459,83
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.647.459,83
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	(743.942,84)
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(743.942,84)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(42.748,30)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(701.194,54)
257	03.2.2.010	Impostos s/ vendas e serviços	
1775	05	RECEITA LIQUIDA	3.903.516,99
701	06	CUSTOS	1.729.442,66
711	06.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS/CONSUMIDAS	1.729.442,66
712	06.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.729.442,66
714	06.3.01.001	Custo das mercadorias utilizadas na prestação de serviço	1.729.442,66
1783	07	RESULTADO BRUTO	2.174.074,33
850	08	DESPESAS	1.468.646,27
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.468.646,27
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	337.862,02
884	08.1.01.001	Salários	293.835,50
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00
922	08.1.01.005	13-Salário	29.482,52
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	90.642,14
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	64.663,59
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	25.978,55
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	1.040.142,11
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	5.895,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	21.638,75
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	601.650,00
1034	08.1.03.036	Despesas Operacionais Diversas	410.958,36
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	705.428,06
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	705.428,06
388	15	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO	545.150,41
396	15.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	545.150,41
418	15.01.002	Lucros Distribuídos	545.150,41
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.277,65
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	160.277,65
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	160.277,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados.

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CPF: 398.204.243-72
CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2022 a 31/12/2022

Página 17 de 23

Página: 17

Fls 0398

Proc. Nº 005/2023

Ass



2022

Nome	
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	705.428,06
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	0,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(362.003,01)
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	305.324,17
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	648.749,22
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	545.150,41
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	266.850,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(812.000,41)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(163.251,19)
Disponibilidades no Início do Período	2.785.070,95
Disponibilidades no Final do Período	2.662.727,49
Variação das Disponibilidades	(122.343,46)

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA Fis

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2022 a 31/12/2022

0399 página 18 de 23
Página: 18

Proc. Nº 005 / 2023

Ass. 

2022

Nome

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO

1.904.664,47

SALDO NO FINAL DO PERÍODO

2.064.942,12

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

Contabilista

CPF: 398.204.243-72

CRC: 06913

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

